

# Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)

## Aftaler og stamkort i kommuner

### Dato:

21. februar 2024

### Projektleder:

Jeanette Jensen

### Deltagere:

Alle 98 kommuner, KL

### Leverandør:

EOJ-leverandører: Systematic (Cura), KMD (Nexus)

### Formål:

Projektets primære formål er at understøtte kommunerne i implementeringen af løsningerne "Fælles Stamkort" og "Aftaleoversigt", samt at sikre fremdrift i kommunernes anvendelse af løsningerne.

Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får nemmere og sikker adgang til stamoplysninger om patienten/borgeren på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner i kommuner, på sygehuse og lægepraksis mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

**Læs mere om projektet:** <https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner>

### Projektstatus

**Fælles Stamkort:** I alt har 94 kommuner teknisk installeret Fælles Stamkort, heraf 79 kommuner med organisatorisk ibrugtagning. Ved udgangen af Q1 2024 forventes 88 kommuner at anvende Fælles Stamkort. Tidsplan for organisatorisk ibrugtagning udestår for 5 kommuner. [DK-kort viser status for kommunernes ibrugtagning af Fælles Stamkort.](#)

Krav om logning udfordrer anvendelse i nogle kommuner. Ændring af *Bekendtgørelse om drift mv. af den fælles digitale infrastruktur*, som netop har været i høring, muliggør brug af anden entydig identifikation på de personer, der foretager opslag. Ændring forventes at træde i kraft 1. marts 2024, men understøttes først i EOJ-systemerne ifm. implementering af borgerens fravalg af genoplivning i Fælles Stamkort.

**Aftaleoversigt:** I alt 80 kommuner deler aftaler. Tidsplan udestår for 4 kommuner. Ved udgangen af Q1 2024 forventes 92 kommuner at dele aftaler. [DK kort viser ibrugtagning af aftaleoversigt i kommunerne.](#)

Flere kommuner oplever behov for informationsindsats til borgerne, som ser kommunale aftaler gennem MinLæge App, i forhold til at forstå visning af tidspunkt og varighed for aftaler. Der er fortsat udfordring med korrekt visning af mødested for visse typer aftaler for Cura-kommunerne. En løsning af dette er i proces mellem Systematic og udvalgte kommuner. Forretningsregel om deling af repeterende aftaler er ændret fra 180 dage til 30 dage. Systematic har implementeret ændringen. KMD arbejder aktuelt på ændringen.

**Manglende tidsplaner:** For begge løsninger gælder, at MedCom i samarbejde med KL følger målrettet op for kommuner, som mangler tidsplan.

**Statistik for anvendelse:** MedCom og de kommuner, som har ønsket det, får nu tilsendt statistik vedr. kommunernes brug af løsningerne. Statistikken anvendes som led i opfølgning på implementering.

### Største risiko i projektet

Forsinkelser eller fejl i EOJ-systemer. Kommuner mangler ressourcer til den tekniske implementering. Krav om logning og uklar lovgivning udfordrer nogle kommuners ibrugtagning. Manglende ressourcer i nogle kommuner udfordrer forberedelse og ibrugtagning. MedCom følger tæt op med kommuner, som mangler tidsplan for ibrugtagning og støtter op, så vidt muligt.

### Milepæle

	Plan	Nået/aktuelt
1. Alle kommuner anvender Fælles Stamkort <sup>1</sup>	31.12.2023	79/94 <sup>2</sup> /98
2. Alle kommuner kan vise aftaleoversigt i EOJ-system	31.12.2023	79/98
3. Alle kommuner deler aftaler i Aftaleoverblikket	31.12.2023	80/98


Pga. EOJ-skifte vil 2 kommuner først kunne implementere i første halvår 2024

<sup>2</sup> 79/94 dækker antal kommuner med hhv. organisatorisk og teknisk ibrugtagning

Monitorering


Aftaler og stamkort i kommuner

Overblik ibrugtagning i kommunerne

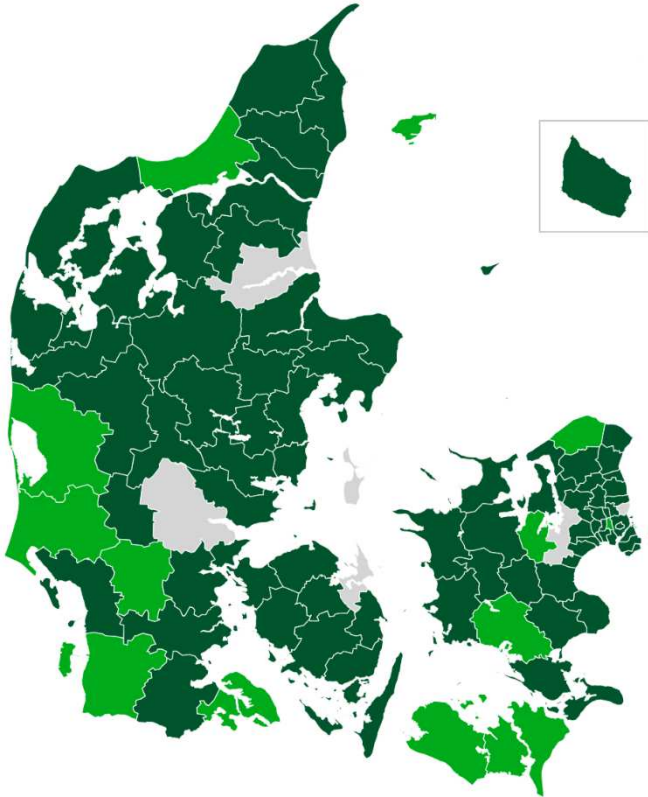

Danmarkskort ibrugtagning Fælles Stamkort - [Link](#)

Mørkegrøn	– i drift
Lysegrøn	– tidsplan foreligger
Lysegrå	– tidsplan mangler

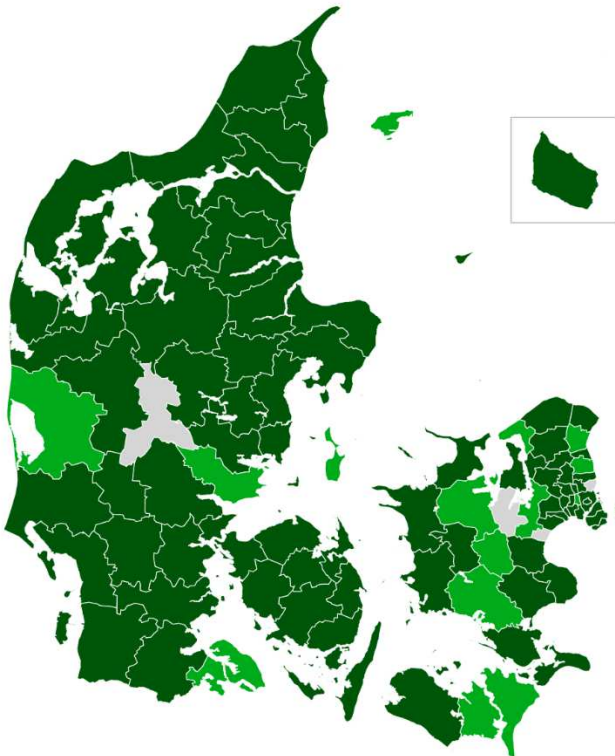

Danmarkskort ibrugtagning Aftaleoversigt [Link](#)
