



Dato 26. oktober 2021

Navn Rikke Viggers

Email riv@medcom.dk

Notat vedrørende økonomi i Forløbsplansprojektet

Med overenskomstaftalen mellem RLTN og PLO blev det aftalt at implementere digitale forløbsplaner i overenskomstperiode 2018-2020. Der blev med aftalen afsat midler til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplanerne på hhv. 27 mio. kr. 2018, 27 mio. kr. i 2019 og herefter 20 mio. kr. i 2020 og varigt. Heraf afsættes 7.5 mio. årligt til frikøb af borgernes login via NemID i praksissektoren.

Jf. *Forståelsespapir vedr. økonomi og udmøntning af midler til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis 22. december 2017* blev der aftalt denne fordeling af midlerne.


Fordeling aftalt i 2017	2018	2019	2020	2021 og fremover
MedCom	8.400.000	10.200.000	4.500.000	4.500.000
KiAP	2.100.000	5.300.000	5.000.000	5.000.000
LPS	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
SUM		1.000.000		
I alt	19.500.000	19.500.000	12.500.000	12.500.000

Der udarbejdes årligt en aktivitets- og leveranceoversigt som ligger til grund for udbetalingen til KiAP.

Udbetaling til lægesystemleverandørerne sker pba. samarbejdsaftaler som definerer milepæle for udbetalinger – fx implementering og certificering i et nyt forløb. Lægesystemerne er jf. samarbejdsaftalerne forpligtet til at bidrage til udvikling og drift på PLSP-plattformen.

Fra 2021 er den faste bevilling reduceret med ca. 1.5 mio. Årlige mindreforbrug ift. bevillingen er overført mellem årene efter konkret aftale. De årlige budgetter til teknisk udvikling, udbredelse og drift og forløbsplaner har dermed samlet udviklet sig således (skematisk og grafisk):

UDVIKLING	2018	2019	2020	2021	2022
Bevilling	19.500.000	19.800.000	12.800.000	11.400.000	11.600.000
Overført fra tidligere år		4.200.000	4.189.000	6.400.000	
Samlet budget	19.500.000	24.000.000	16.989.000	17.800.000	11.600.000
Forbrug*	15.281.265	15.771.722	10.622.055	16.286.250	
Restbudget	4.218.735	8.228.278	6.366.945	1.513.750	11.600.000
* Forventet forbrug 2021					

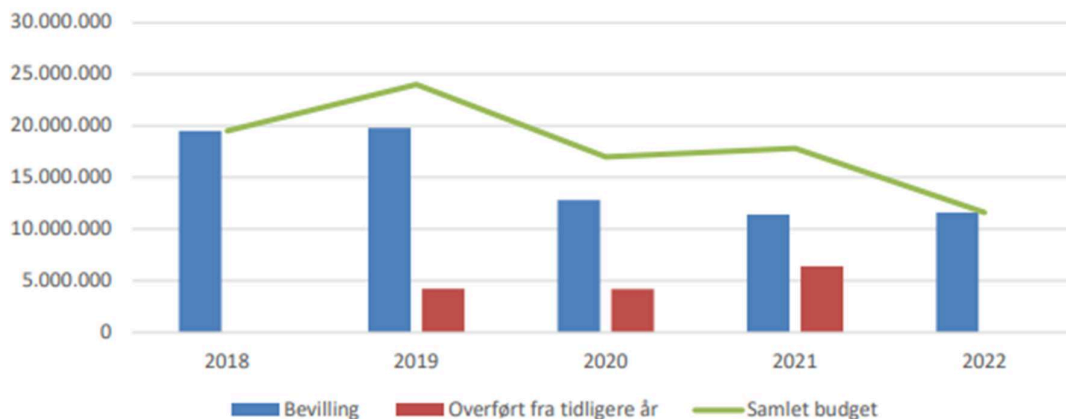

Behovet for overførsel af midler mellem regnskabsårene er til dels begrundet i, at udbetalinger af samarbejdsaftaler i mange tilfælde er sket pba. udviklingsopgaver planlagt til release ved årsskiftet. Derudover har et generelt lavt aktivitetsniveau ifm. COVID-19 situationen, betydet et lavt forbrug ift. budgettet i 2020 og til dels 2021.


Fremtidig økonomi

Med redueringen af den faste bevilling fra 2022 og fremover, er der behov for en ny aftale om fordeling af midlerne mellem parterne.

Af nedenstående fremgår den budgetmæssige fordeling af de tildelte midler (med inkludering af de overførte midler fra 2018, 2019 og 2020).

Der er indsat forslag til fremtidig fordeling (2022 og fremover):

BUDGETSAMMENSÆTNING**	2018	2019	2020	2021	2022 og fremover
MedCom	5.400.000	11.375.000	6.192.000	9.889.000	5.900.000
KiAP	5.100.000	5.300.000	5.300.000	5.000.000	4.200.000
LPS inkl. PLSP	9.000.000	7.325.000	5.497.000	2.911.000	1.500.000
I alt	19.500.000	24.000.000	16.989.000	17.800.000	11.600.000
** Inkl. overførte beløb					

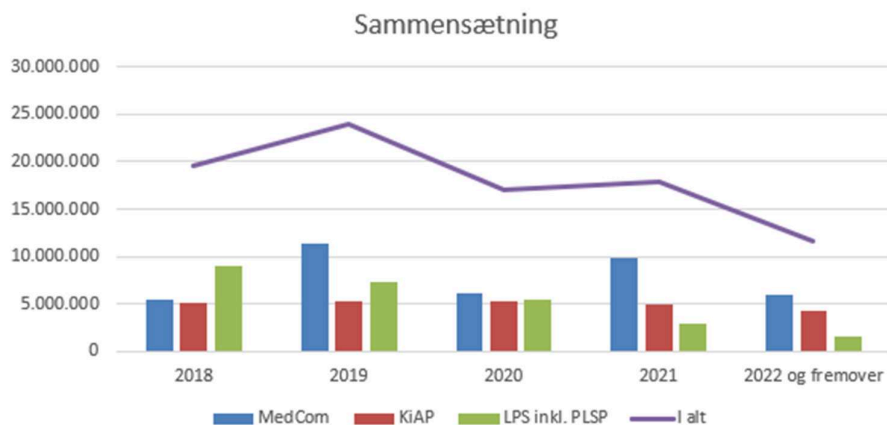

MedCom's andel skal dække 3.9 mio i faste udgifter:

Fordeling MedCom	
Lønninger	2.600.000
Teknisk projektledelse	500.000
Datakonsulenter	800.000
I alt	3.900.000

Resterende MedCom andel (2 mio) udgør de frie midler til udbredelses- og projektaktiviteter. Dette inkluderer udgifter til løbende aktiviteter og til kendte kommende udviklingsopgaver, eksempelvis:

- IT-udvikling, fx ny patientvisning i Min Læge
- FMK-integration
- Konsolideringsaktiviteter
- Datakvalitetsarbejde
- Evaluering
- Statistik og monitorering
- Udarbejdelse og distribution af informationsmaterialer (videoer og brochurer)
- Stande på konferencer og udstillinger (fx Lægedage)
- Møder, mødegodtgørelse og honorarer til læger
- Relaterede projekter: Klyngevisninger, RKKP-indberetninger og deling af Forløbsplaner

I 2021 har der været mulighed for at medfinansiere digitalisering af Graviditetsforløbet i almen praksis. De afsatte MedCom-lønmidler inkluderer MedCom-lønninger ifm. Graviditetsforløbet i 2022 også, men der afsættes ikke yderligere projektmidler fra Forløbsplansprojektet til Graviditetsforløbet.

Der udarbejdes et budget som skal godkendes af projektets styregruppe. Evt. rest disponeres af styregruppen til prioriterede udviklings- og udbredelsesaktiviteter.
