




Operationel styregruppe (OSG)

Pilotprojekt for modernisering af MedCom meddelelsesinfrastruktur

Møde 25. marts 2021

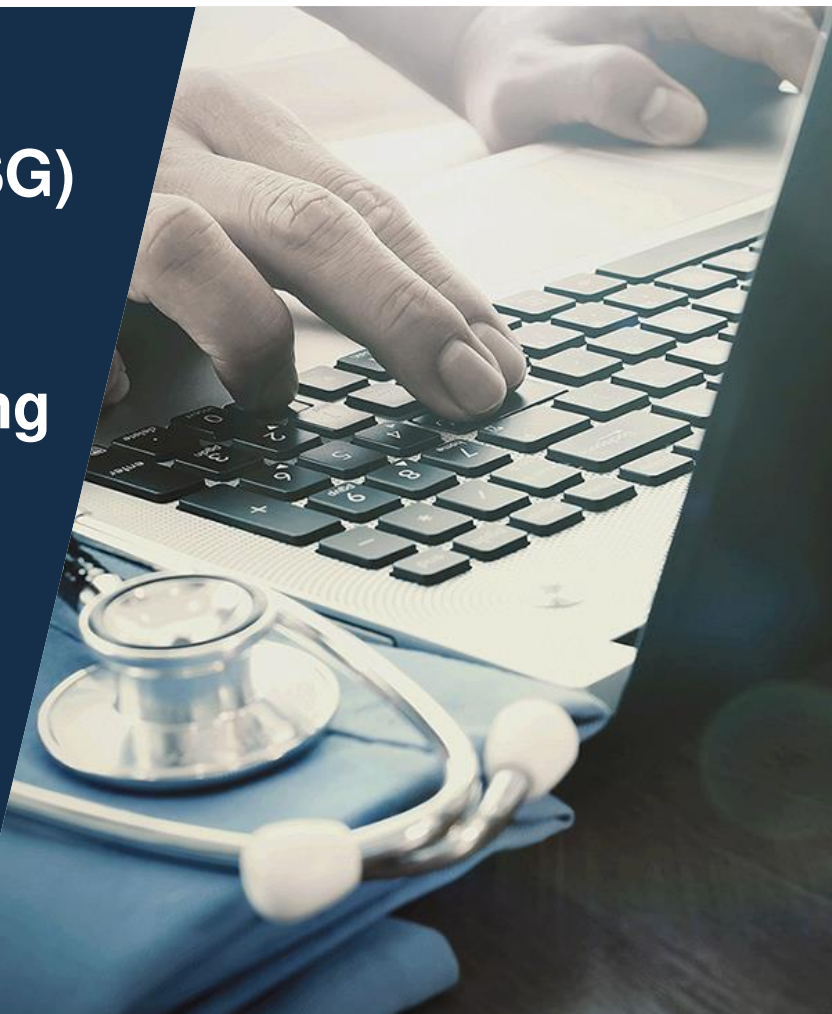

Dagsorden OSG 25.3.21

1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af referat
3. Tilbage melding fra MedComs styregruppe
4. Status for pilotprojektet (fremdrift)
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder
 - Er der tid nok i maj til at efterbehandle connectathon, færdiggøre evalueringen og godkende den i OSG?
 - Skal møder spredes lidt mere, så de er med længere afstand end 2 uger?
6. Evaluering. Status og drøftelse
7. Evt.

Velkomst og præsentation

Velkomst

Godkendelse af referat

Er udsendt og ligger i Sharepoint

Tilbage melding fra MedComs styregruppe

v./Lars Hulbæk

MedComs styregruppe 17/3: Modernisering af infrastruktur

- Pilotafprøvning forsinket
- Uforudsete tekniske udfordringer i centrale eDelivery komponenter hos DIGST
- Bekymring hos pilotdeltagerene om projektets soliditet frem mod ØA
- Fortsat fuld opbakning fra pilotprojektets deltagere til konceptet / målbilledet

Kommentarer

- a. PLO opmærksomhed på, om infrastrukturen trods forsinkelsen risikerer at komme før implementeringen af FHIR, jf. de lange udsigter for implementering af vores 2 FHIR-spydspidser
- b. DIGST forsikring om, at eDelivery og MedComs projekt har høj prioritet internt i Digitaliseringsstyrelsen

Beslutning

- Tager forsinkelsen i pilotprojektet til efterretning
- Tager til efterretning at projektets første resultater ultimo april stilles til rådighed for stat, regioner og kommuner
- Tager til efterretning at den endelige afrapportering inkl. forslag til transitionsfaser forelægges MedComs styregruppe på mødet i juni 2021

MedComs styregruppe 17/3: Modernisering af infrastruktur

OBS. Styregruppen godkendte også etablering af gateway mellem SDN og det pulveriserende internet.

Status for pilotprojektet

Hvad omfatter det
Fremdrift

Status for pilotprojektet (fremdrift)

Bordet rundt

- eDelivery, hvor ifht Access Points mm.
 - DIGST/NetCompany
 - PLSP/MultiMed
 - Region Hovedstaden
 - Herlev/KMD
 - MedCom/Trifork
- Dokumentdeling
 - PLSP
 - MedCom/Trifork
- Forsendelsesstatus/ Track 'n Trace
 - PLSP/MultiMed
 - Region Hovedstaden
 - Herlev/KMD
- Forretningsadressering
 - PLSP/MultiMed
- Min Læge
 - PLSP
- Andet

Farvedots viser status for de enkelte delprojekter pr. 18.3

Væsentligste risici /tabel ændret efter sidste OSG

Risiko beskrivelse	Konsekvens	Modforanstaltning
Dynamic discovery etableres for sent	Piloten kan ikke gennemføres som planlagt	Tidsplanen ændres så dynamic discovery kan afprøves
Ressourceallokering hos aktører svigter	Forsinket leverance hos én aktør forsinker tidsplanen	Fokus i projektet på at fastholde fremdrift og allokere ressourcer
Yderligere forsinkelser af piloten	Evalueringen forsinkes Pilotens resultater kan ikke nå at indgå i ØA22	Tidsplanen ændres, så de ønskede aspekter afprøves. Input til ØA22 tilpasses hertil.
Parterne kan ikke nå at skabe overblik over egne omkostninger til moderniseret infrastruktur	Parterne vil være tilbageholdende med at træffe beslutninger i ØA22	Tidsplanen ændres, så de ønskede aspekter evalueres. Input til ØA22 tilpasses hertil.


Tidsplan for pilotprojektet og møder

Tidsplan



Created with Free Edition

Printed: March 25, 2021

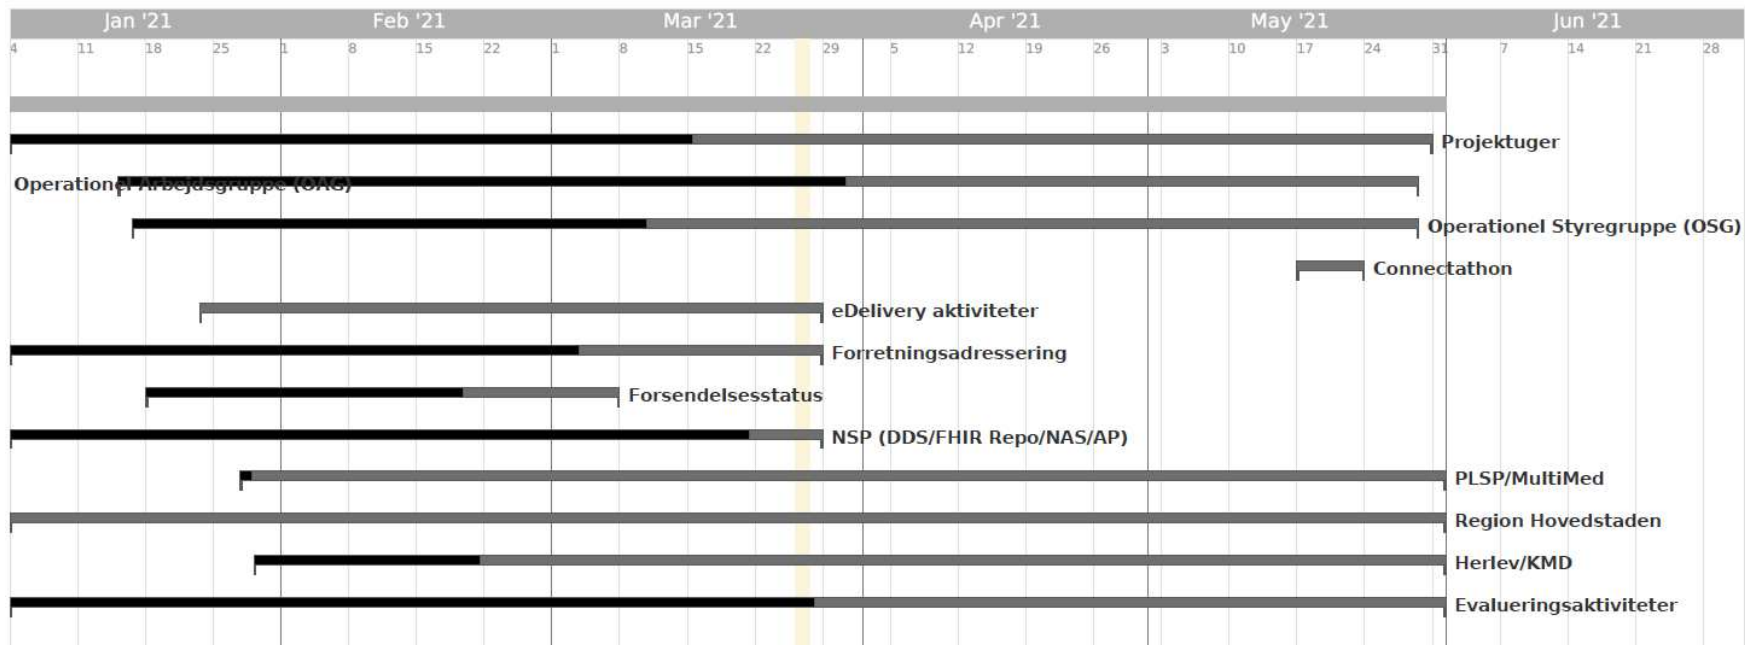

Mødeplan for pilotprojektet

- Connectathon varighed 3 timer
- Efterfølgende loganalyse mm
- Kl. 9-12/13-16

Tidsplan pr 15.3:

	Måned: Januar							Februar							Marts							April							Maj						
Uge:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Pilotprojekt																																			
Projektaktiviteter																																			
Evaluering																																			
Connectathon																																			
Operational styregruppe																																			
OSG Møde 1		15.1																																	
OSG Møde 2								24.2																											
OSG Møde 3												25.3																							
OSG Møde 4																																			
Operational arbejdsgruppe																																			
OAG Møde 1		14.1																																	
OAG Møde 2				28.1																															
OAG Møde 3						11.2																													
OAG Møde 4								1.3																											
OAG Møde 5											18.3																								
OAG Møde 6																x																			
OAG Møde 7																																			
OAG Møde 8																																			
MedCom Styregruppe											17.3																								

Forslag
OSG4 Tors 27.5 kl 10

Forslag
OAG6 Tors 15.4 kl 13
OAG7 Ons 28.4 kl 13
OAG8 Tirs 11.5 kl 13

Evaluering 1/3

Område	Opgaver	Generel status	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21
Projektledelse og administration																
	Plan															
	Rapport udarbejdelse		v.0.4				v.0.5		v.0.6			v.0.8				v.1.0
	Konsolidering med den operationelle styregruppe		OSG				OSG					OSG				OSG
Generel																
	Evalueringsmodeller															
	Målbillede evaluerings punkter															
	Konsolidering med Asger															
	Rapport del				v.0.6		v.0.8		v.0.9			v.1.0				

Evaluering 2/3

[illegible]

Evaluating 3/3

Område	Opgaver	Generel status		Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21
Evalueringpunkter: Case baseret og teoretisk																	
Infrastruktur Community																	
	Estimering på Governance og management																
	Evaluering																
	Rapport del																
Infrastruktur Transition																	
	Estimering på overordnet transitions plan																
	Evaluering																
	Rapport del																
eDelivery cases																	
	AP cases og estimerer																
	SMP/SML cases og estimerer																
	Governance cases og estimerer																
	Arkitektur cases og estimerer																
	Sikkerheds cases og estimerer																
	Innovations cases og estimerer																
	Evaluering																
	Rapport del								v.0.9		v.1.0						

Evaluering. Status og drøftelse

Eventuelt

