




Operationel styregruppe (OSG)

Pilotprojekt for modernisering af MedCom meddelelsesinfrastruktur

Møde 29. april 2021

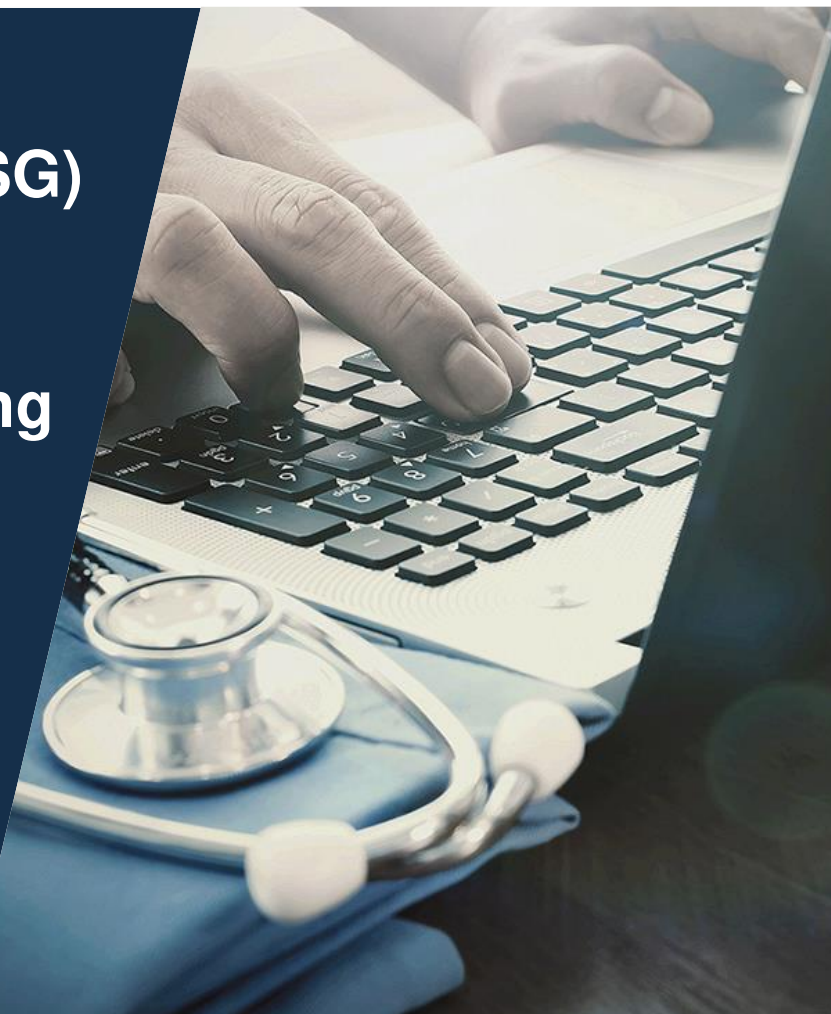

Dagsordenen OSG 29.4.21

1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af referat
3. Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af revision af arbejdsplan og tidsplan
 - Status for tekniske udfordringer mellem access punkter (DIGST)
 - Status for færdiggørelse af vejledninger (DIGST)
4. Status for pilotprojektet (fremdrift – bordet rundt)
5. Tidsplan for pilotprojektet og møder
6. Behov for revision af samarbejdsaftaler?
7. Evaluering. Konsekvenser af ændret arbejds- og tidsplan
8. Evt.

Velkomst og præsentation

Velkomst

Godkendelse af referat

Er udsendt og ligger i Sharepoint

Kort projektstatus fra Ole og oplæg til drøftelse af
revision af arbejdsplan og tidsplan



Kort projektstatus

Projektet vurderer på baggrund af den pt manglende fremdrift, at projektet ikke kan gennemføre Connectathon på denne side af sommerferien 2021.

Dette begrundes i

- den pt manglende fremdrift ift. at etablere forbindelse mellem MultiMeds AP og NetCompany's AP.
- den pt manglende fremdrift ift. at få dokumenteret projektsetup'et fra DIGST.
- At KMD skal bruge 6 uger fra dokumentation modtages fra DIGST til Connectathon kan afvikles med deres deltagelse.

Da projektet har erfaring for, at et problem afløses af et andet, vurderer vi med 7 uger til projektlederens sommerferie starter, at det ikke er realistisk at presse på for at gennemføre Connectathon på denne side af sommerferien.

Kort projektstatus

Projektet beder dog parterne om at gennemføre så meget af udviklingen, som det er muligt

Status for pilotprojektet

Hvad omfatter det
Fremdrift

Status for pilotprojektet (fremdrift)

Bordet rundt

Tidsplan for pilotprojektet og møder

Tidsplan



Indsættes her

Mødeplan for pilotprojektet

Arbejdsgruppemødet i maj foreslås aflyst.

Styregruppemødet 26. Maj foreslås fastholdt.
MedCom flytter mødet efter behov.

Evaluering



Eventuelt

