



Styregruppemøde for udbredelse af digitale forløbsplaner

10. Februar

Rikke Viggers



Dagsorden

1. Opsamling fra sidste styregruppemøde
2. Ny patientvisning i Sundhedsmappen og MinLæge, v. Henrik Rasmussen
3. Release af Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom
4. Status på udbredelse af forløbsplaner
5. Teknisk udvikling og konsolidering i 2021
6. Budget for 2021
7. Projektets risici
8. Næste møde

1. Opsamling fra sidste styregruppemøde

- a) Graviditetsforløb i almen praksis
- b) Klyngevisning af forløbsplansdata
- c) FMK integration
- d) Forankring af arbejdet for deling af forløbsplaner i et samlet patientoverblik



2. Ny patientvisning i Sundhedsmappe og MinLæge

Status på arbejdet og foreløbig tidsplan

- "Koncept for øget patientengagement"
 - Humade. Fase 1. Leverance juni 2021
 - Kliniske Brugergruppe er faglig reference for arbejdet.
- Koordinering med "Min Læge"
- API udvikling (deling af Forløbsplaner i Samlet patientoverblik)

✓ Målsætning om release af første version i november 2021

Forslag

Fokus- områder og tidsplan

Koncept for øget patient engagement

- Research af best practice og nye ideer
- Patient-interviews
- Patientforeninger.
- Skitser m wireframes
- Brugerdialog om ideer
- Revision af wireframes
- Kvalificeret idé-katalog med visualiserede del-elementer

Bølge 1 Wireframes til app (Basis-features)

- Konkretisere basis-features til første bølge implementering
- Brugertest
- Hand over til tech team

Implementering (af MVP)

Test

Digitalt
design

Bølge 2 Wireframes til app (mere avancerede features)

- Konkretisere avancerede features til anden bølge implementering
- Brugertest og revisioner af wireframes
- Prioritere features

Implem

Digitalt
design

Sommer-
ferie

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov

3. Release af Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom

- Status på implementering
 - Pilot i gang siden 7. december
 - Klinikbesøg hos læger med 6 af 7 lægesystemleverandører
- Kommunikation om hjerteforløbsplanen før OK21
 - Undervisning af Datakonsulenter og LPS support.
 - Brev (PLOrientering, LPS, DKO, KiAP.dk, MedCom.dk)
 - FaceBook
 - Vejledninger på KiAP.dk
 - Speeddrawing
 - Evt. Webinar




4. Udbredelsesaktiviteter – status og planer

- Samarbejdsaftale med Datakonsulenter
- Aftale om besøgslinikker
- Facebookgruppe + evt.
- Informationsmateriale på KiAP.dk
- Undervisning (klinikpersonale og på Lægedage)
- Konferencer (Lægedage og FSKIS)
- Patientforeninger
- Udsendelse af informationsbrev og pixivejledning (efter OK21)
- Udbredelseskonsulent (efter OK21)

Status for udbredelse

Nye statistikker

Antal forløbsplaner pr. år (TOTAL)

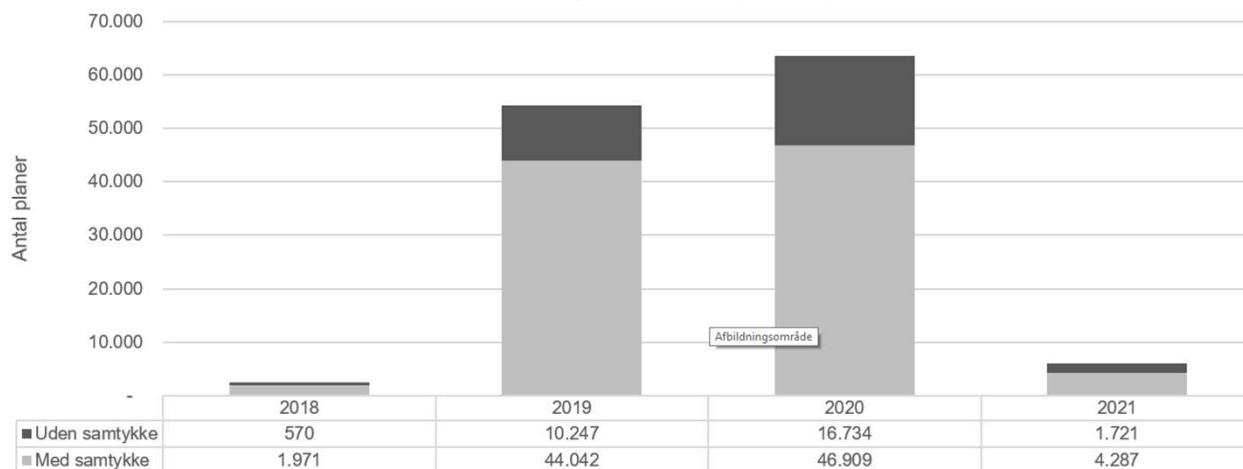

Aktive klinikker: 12 måneder
Planer med/uden samtykke

5. Teknisk udvikling og konsolidering i 2021

- Ny patientvisning på Sundhedsmappe *KLAR*
- Aktivering af forløb
- Integration til DDV
- Integration til Min Læge
- FMK integration
- SSO for patienter
- Datakvalitet
- Løbende iht. brugerfeedback
- Konsolidering



Tidsplan


FORLØBSPLANER I ALMEN PRAKSIS	2021											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
AP 1 PROJEKLEDELSE OG KVALITETSSIKRING												
1.1 Teknisk projektledelse og kvalitetssikring												
1.2 Risici												
1.3 Teknisk back-log												
1.4 Prioritering af teknisk back-log												
AP 2 NYE FUNKTIONER												
2.1 Integration til DDV												
2.1.1 Analyse												
2.2 API til udtræk af en forløbsplan												
2.2.1 Specifikation (ver. 1, ver. 2)												
2.2.2 Udvikling ver. 1 (Et Samlet Patientoverblik)												
2.2.3 Udvikling ver. 2 (MinLæge App)												
2.3 Udvidelse af testjournal												
2.4 Aktiveringsprocedure for forløb												
2.5 Synkronisering af medicinoplysninger fra FMK												
2.5.1 Pauseret medicin (forberedelse)												
2.5.2 PLSP integration til FMK												
2.6 SSO												
2.6.1 Analyse												
2.7 Datakvalitet												
2.7.1 Hjerteforløbsplan												
AP 3 DOKUMENTATION												
3.1 Løbende opdatering af FLP dokumentationen												
AP 4 RELEASEPLANLÆGNING												
4.1 Planlagte FLP releases												

Konsolideringsprojekt

KiAP og PLSP udarbejder et katalog over indsatsområder, hvor relevante forhold belyses.

v0.5 klar til ultimo februar og v0.9 til ultimo marts.

Indsatser indarbejdes i igangværende udviklingsaktiviteter med fokus på gevinster for brugerne

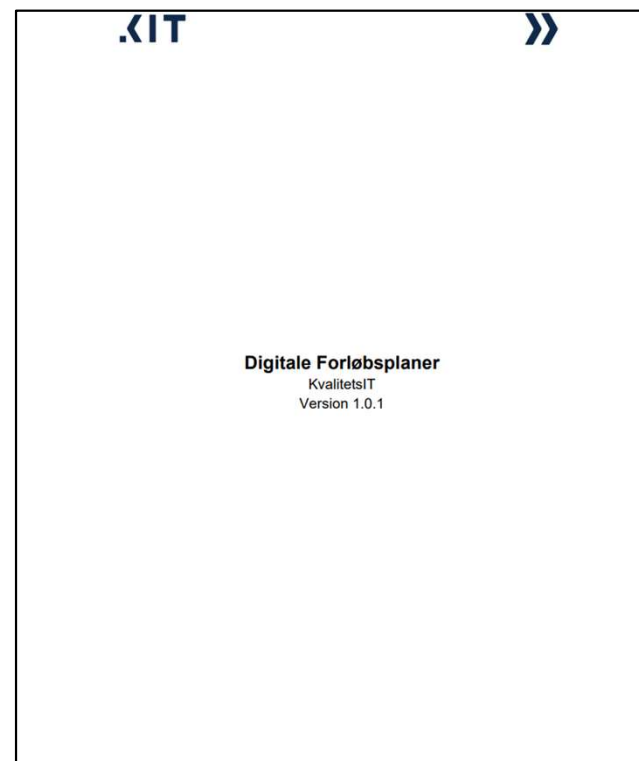

6. Budget 2021

- Incl. Svangre jf. aftale
- Forbehold for fordeling
 - konsolideringstiltag og andre aktiviteter
- Udgifter til App visning er et overslag
- Diverse
 - udbredelsesaktiviteter, konsolidering, brugerønsker

Budget for Forløbsplaner og Svangre 2021			
Aktiviteter	FLP	Svangre	2021 i alt
Løn MedCom, incl overhead og rejseudgifter			2.700.000
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000		500.000
Svangre analyse		100.000	100.000
FLP i Min Læge, patientperspektiv (Humade)	250.000		250.000
FLP i Min Læge design konsulentbistand	250.000		250.000
Konsolidering	100.000		100.000
Møder/arrangementer			
Lægefaglig gruppe: svangre		9.000	9.000
Forplejning (undervisning, test, møder) FLP	30.000		30.000
Patientpanel APP	9.000		9.000
Forplejning (undervisning, test, møder) svangre		30.000	30.000
Mødegodtgørelse			
Honorar Lægefaglig gruppe: Svangre		25.000	25.000
Honorar Klinisk brugergruppe	30.000		30.000
Honorar Teknikgruppe FLP	50.000		50.000
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP) konsolidering, FMK m.m	2.000.000		2.000.000
LPS udestående vedr. Hjerterforløbsplaner fra 2020	611.000		611.000
LPS svangre		300.000	300.000
KiAP	5.000.000		5.000.000
FMK integration (PLSP)	500.000		500.000
Datakonsulenter (150.000 x 5)	750.000		750.000
PLO (incl. PLSP og Trifork) Svangre teknisk implementering		2.046.650	2.046.650
Informationsmaterialer			
Informationsmaterialer (udarbejdelse og udsendelse)	50.000		50.000
Konferencer			
Lægedage, FSKIS	130.000		130.000
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inc. programmel og licens	41.400		41.400
FLP visning i Min Læge (implementering)	500.000		500.000
Projekt, excl lønudgifter MedCom	10.801.400	2.510.650	
Budget 2021 i alt incl lønudgifter			16.012.050
Indtægter 12.800.000 + 6.366.945 (fra 2020) - 1.400.000			17.766.945
Rest - diverse			1.754.895

7. Risici

1. Udbredelse og fastholdelse
2. Hjerteforløbsplan. Timing ift. OK21
3. Teknik. Konsolidering
4. Covid-19. Tab af momentum

8. Næste møde

- 19. maj

