

MedCom13 > Sådan går det  
Juni 2023



## Indledning

### Vision for MedCom13

MedComs styregruppe har fastlagt følgende vision for MedCom13 (2023-2025):

At arbejde for en moderne, informationssikker og internationalt funderet digital kommunikation, med fokus på hurtige gevinster for det samarbejdende sundhedsvæsen, med blik for samarbejdsflader til andre sektorer.

I årene 2023-2025 vil vi arbejde med en særlig fokuseret indsats på, at:

- Frigøre personaletid til kerneydelsen gennem tværsektoriel datadeling, videomøder, borgerrettede løsninger og praksissektorens IT-redskaber.
- Implementere de første nationale FHIR-standarder og sikre et praktisk erfaringsgrundlag for en fortsat økonomisk bæredygtig modernisering af standarder og infrastruktur.
- Forbedre datakvaliteten og øge praksissektorens datadeling med patienter, kommuner og sygehuse

# MedCom13 – overblik over projektstatus

Juni 2023

## MedCom13-projektmonitorering – sådan går det

Arbejdsprogrammet for MedCom13 består af en lang række projekter. Den overordnede projektstatus er gengivet herunder.

Detaljer findes efterfølgende statusrapportering.

### Modernisering af MedCom kommunikationen

Projekt	Status	Bemærk især
Advis om sygehusophold		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Forsinkelser hos én eller flere parter.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Alle testmaterialer (testprotokoller, testfiler mv.) er udarbejdet og gjort tilgængelige.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Alle kommuner modtager adviser gennem Fælleskommunal Beskedfordeler (1/11-23).</p>
Korrespondancemeddelelse		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Udhuling af forretningsmæssig funktionalitet og teknisk kvalitet da omkostninger for udvikling kan blive en showstopper.</p> <p>At it-leverandørerne eller aktører nedprioriterer ny KM i deres roadmaps.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Afholdt webinar med 140 deltagere. Opdateret version af KM samt testprotokoller publiceret 14/4-23.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Infobrev sent ud til alle relevante it-leverandør. XSLT-skema publiceret.</p>
Roadmap for FHIR-standarder		Projektgrundlag til godkendelse på mødet i MedComs styregruppe den 22. juni.
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur		Projektgrundlag til godkendelse på mødet i MedComs styregruppe den 22. juni.
SOR-adressering		Projektgrundlag til godkendelse på mødet i MedComs styregruppe den 28. september.

### Datadeling via den fælles infrastruktur (NSP)

Projekt	Status	Bemærk især
Aftaler og stamkort i kommuner		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Forsinkelser eller fejl i leverancer fra EOJ-leverandører.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Fælles Stamkort: 54 kommuner er i drift og 28 kommuner har tidsplan for ibrugtagning. Aftaledeling: 23 kommuner deler aftaler, 7 kommuner har tidsplan for ibrugtagning.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Flere kommuner kommer i drift.</p> <p>Tidsplaner for ibrugtagning af stamkort og aftaleoversigt foreligger for alle kommuner.</p>

Aftaler og stamkort i praksis-sektor		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Manglende økonomi til implementering af Fælles Stamkort</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Åbning for visning af aftaler i MinLæge og i lægepraksissystemerne</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Påbegyndelse af udvikling af Fælles StamKort i PLSP og lægepraksissystemerne</p>
Deling af planer	<p>SDS har genstartet projektet og indgår aftaler med MedCom om samarbejde ifm. beskrivelse af use cases og afprøvningsprojektet samt tilrettet version af CDA-standard for planer. MedCom har planlagt levering på CDA-standarden i august 2023. SDS i god dialog med potentielle pilotdeltagere. Afklaring forventes gennemført inden sommerferien. SDS forventer at projektet strækker sig ind i 2025.</p>	
Fravalg af genoplivning	<p>Projektet er under afklaring.</p> <p>Det er besluttet at Fravalg af genoplivning skal indgå i Fælles Stamkort, og MedCom vil derfor opdatere CDA standarden for Fælles Stamkort.</p>	
Data fra borgerens eget hjem		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Forsinkelser i forhold til afvikling af end-2-end test grundet manglende sundhedsprofessionel visning på sundhed.dk.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>At få sat WebPatient (SynLab) og Diaprofil (ZiteLab) i drift, som de første afsluttede PRO-projekter.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Få AmbuFlex sat i drift.</p>
Dosisdispensering		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Selv om aftale om honorar til lægerne er på plads, er der fortsat en stor risiko for fremdriften, hvis lægerne stadig ikke ønsker at sætte flere borgere på dosispakket medicin. Ligeledes er det en stor risiko hvis hospitalerne fortsat ikke vil forholde sig til borgerens dosispakkede medicin, så bliver det svært at fastholde almen praksis i opgaven.</p> <p>Hvis der ikke er en ensartethed i håndtering af dosispakket medicin i kommunerne, kan det også øge risikoen for, at lægerne ikke ønsker at sætte flere borgere på dosispakket medicin.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Både programstyregruppen og den tværsektorielle arbejdsgruppe er blevet nedsat og de første møder er afholdt.</p> <p>Der er ligeledes ved at blive indgået samarbejdsaftale med datakonsulenterne i alle 5 regioner om undervisning af almen praksis</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Undervisning af datakonsulenter venter lige efter sommerferien, hvorefter der skal tilbydes undervisning til almen praksis</p>

### Sundhedsjournalen

Projekt	Status	<u>Bemærk især</u>
Sundhedsjournal version 4		<p>MedComs aktiviteter er under afklaring. På mødet orienteres styregruppen særskilt om planerne i for Sundhedsjournal version 4 og hvor MedCom tænkes ind.</p>
Udbredelse i kommuner		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>At yderligere kommunale leverandører ikke ønsker at implementere knap-løsning til Sundhedsjournalen.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p>

		<p>44 kommuner benytter knapløsning, og yderligere 17 kommuner har tilkendegivet at ville implementere knapløsning. 10 kommuner overvejer at implementere knapløsningen.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>At få den tekniske løsning til auditering i drift, så kommunerne kan påbegynde auditering, og der ikke længere skal sendes borgerbreve ved opslag på Sundhedsjournalen fra kommunerne.</p>
Opkobling af speciallægepraksis		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>E-Journalen skal gå over til lokationsregistrering på basis af SOR-klassifikationen. Dette betyder at Sentinel som koordinerende dataleverandør skal skifte over til SOR-baseret registrering og dette kan give forsinkelser.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Udtræksløsningen er programmeret færdig.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Klinisk test af visningen af speciallægenes egen journaldata.</p>

### Almen Praksis

Projekt	Status	Bemærk især
Digital svangrejournel i almen praksis		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Den største risiko er, at regionerne ikke kan understøtte den digitale henvisning (organisatorisk).</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Projektgrundlag godkendt i MedComs styregruppe den 23. marts i MedComs styregruppe og i styregruppen for Digital løsning til graviditetsforløb den 31. marts.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Første møde i den kliniske brugergruppe gennemført.</p>
Diagnosekort		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Ikke tilstrækkelig understøttelse af god diagnosekodning i lægesystemerne.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Godkendelse af 3 lægesystemleverandører i diagnosepakke v1.0.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Godkendelse af de resterende 3 lægesystemleverandører i diagnosepakke v1.0.</p>
Klinikkens cockpit		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Projektet har stor kompleksitet hvorved det kan være svært at lægge en realistisk plan samt holde fremdrift. Det er derfor vigtigt at nedbryde projektet i overskuelige leverancer og agil udvikling med leverandørerne.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Der er underskrevet pilotaftale med EG Healthcare</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Sprint 0 med pilot-leverandør</p>
Intelligent indbakke		<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Løsningen bliver for dyr at udvikle i forhold til udbytte.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p>

		<p>Besluttet på DAP-styregruppe at gennemføre ny pilotafprøvning med flere klinikker.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Ny pilotafprøvning gennemføres i juni måned.</p>
Egne Laboratorieanalyser	Projektet er under afklaring.	
Apps i almen praksis	😊	<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Misforhold mellem de egentlige hensigter med projektet og det nuværende smalle tekniske scope. At vi derfor kan komme til at "kode til skuffen".</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Indgåelse af aftaler med 2 leverandører om udvikling af løsning.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Kick-off møde planlagt med de 2 leverandører.</p>
Forløbsplaner	😊	<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Manglende ibrugtagning og fastholdelse.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Forløbsplanerne tilgængelig i integreret visning i Min Læge app.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Lægesystemerne certificeret.</p>
Datakvalitet i almen praksis	Under afklaring. Et opdateret projektforslag som bygger videre på det forrige projekt, skal forelægges styregruppen for Digital Almen Praksis d. 15/6-2023.	


### Systemforvaltning

Projekt	Status	Bemærk især
Implementering af Sundhedsdatanet version 4	😊	<p>Projektgrundlag til godkendelse på mødet i MedComs styregruppe den 22. juni.</p> <p>Projektet er forsinket i forhold til oprindelig tidsplan grundet længere afklaringsfase. Forventes ikke at få betydning for slutdato.</p>
Borgerrettede videokonsultationer	Projektet er under afklaring.	
VDX-udbud	😊	<p><u>Den største risiko i projektet</u></p> <p>Få leverandører, der reelt kan byde ind i udbuddet.</p> <p><u>Den største milepæl opnået siden sidste styregruppemøde</u></p> <p>Markedsdialog er gennemført.</p> <p><u>Den største milepæl i nærmeste fremtid</u></p> <p>Godkendelse af udbudsdesign i MedComs styregruppe d. 22. juni.</p>

Den fulde monitorering af alle projektet og basisaktiviteter er at finde via dette link: <https://med-com.dk/projektmonitorering/>

# Overordnet MedCom-monitorering maj 2023

Alle meddelelser pr. måned 1994-2023

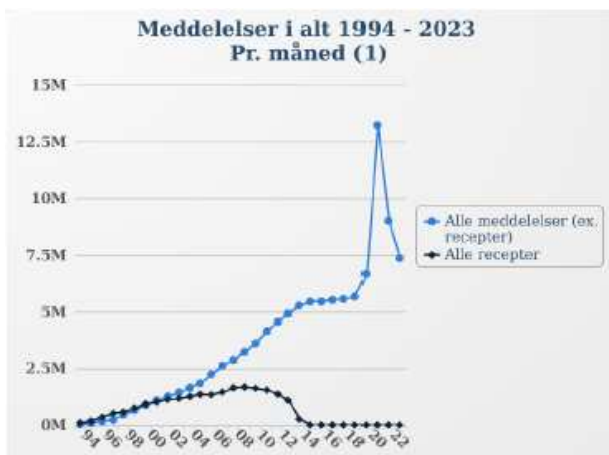

Sygehusmeddelelser pr. måned 1992-2023



Lægemeddelelser pr. måned 1992-2023



Kommunemeddelelser pr. måned 2007-2023



E-journal opslag pr. måned 2004-2017



Hotelkommunikation pr. måned 2003-2023





Status juni 2023



**medcom**
