



Styregruppemøde Digitale Forløbsplaner

13. Juni 2024






Dagsorden

1. Opsamling fra sidste styregruppemøde (O)
2. Godkendelse af ny organisering for digitale forløbsplaner (B)
3. Forretningsmål billede for forløbsplaner (B)
4. Forløbsplaner for KOL (B/D)
5. Forløbsplaner i Sundhedsjournalen (B)
6. Ozempic – Tripple Whammy (B)
7. Økonomistatus for 2024 (D/B)
8. Godkendelse af driftsbidrag til appen Min Læge for formidling af planerne (B)
9. Status på drift og udvikling (O)
10. Status på udbredelse og udbredelsesaktiviteter (O)
11. Projektets risici (O/D)

1. Opsamling fra sidste styregruppemøde

- a) Min Læge app
 - b) Patientlister
 - c) Henvisning til kommunale forebyggelsestilbud
- ✓ **EG Clinea:** Testet og løsningen er udbredt til alle kunder
 - ✓ **EG WinPLC:** Testet og løsningen er udbredt til alle kunder
 - ✓ **XMO:** Testet og løsningen udbredes til alle kunder i løbet af juni
 - **MultiMED:** Testes 14. juni (for den generelle del af opgaven)
 - **Novax:** Testes 13. juni (for den generelle del af opgaven)
 - **MyClinic:** Ikke testet



Kommunal Henvisning

Seneste værdi ⓘ

Rygestatus	Lejlighedsvis	
Højde	1.68	m
Vægt	107	kg
Blodtryk sys.	136	mmHg
Blodtryk dia.	88	mmHg
HbA1c ⓘ	33	mmol/mol
U-Alb / Krea	350	mg/g
Total Kolesterol		mmol/L
LDL Kolesterol		mmol/L
Plasma Kreatinin		μmol/L
eGFR		mL/min
Ejection Fraction		%
Familær Hyperkolesterolæmi		☐
Opret kommunal henvisning		☐
Sidst henvist 27-04-2023 📅		

Teksten, som vi forventer, at den stilles op og ser ud i anamnese feltet i XREF15:

"Patienten har sukkersyge og henvises til kommunal forebyggelsestilbud.

De nyeste målinger viser:

Blodtryk: 190/95 mmHg.

Langtidsblodsukker (HbA1c): 107 mmol/L.

LDL kolesterol: 3 mmol/L.

Vægt: 78 kg og BMI er 24

Aktuelle KRAM faktorer:

Alkoholforbrug 8/uge.

Motion:

Rygestatus: Dagligt.

Patientens eget mål er:

Vil gerne leve mere sundt og gå tur med hunden dagligt.

Der er aftalte mål mellem læge og patient, som er:

Blodtryk: < 150/100 mmHg.

Langtidsblodsukker (HbA1c): < 50 mmol/L.

LDL kolesterol: < 2.3 mmol/L.

Vægt: 59 kg.

Aftalte mål for KRAM faktorer er:

Alkoholforbrug: 53/uge.

Rygestatus: Ophørt.


Motion: Undgår"

2. Godkendelse af ny organisering for digitale forløbsplaner

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Godkender at styringen af projektet digitale forløbsplaner overgår til den nye organisering efter godkendelse i DAP-styregruppen.

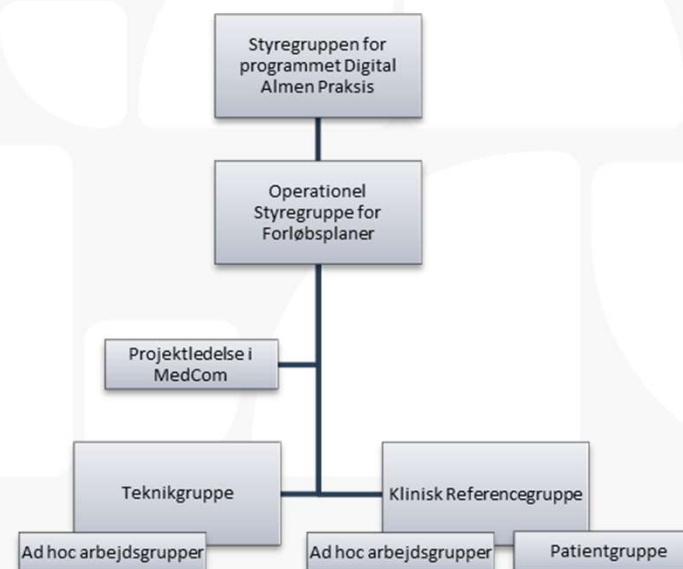



3. Forretningsmålbillede for forløbsplaner

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen


- Tager status for arbejdet med forretningsmålbillede til efterretning.
- Godkender at proces og plan for forretningsmålbilledet behandles i styregruppen for programmet Digital Almen Praksis.

4. Forløbsplaner for KOL

ANALYSENS TILRETTELÆGGELSE

FORESLÅET TILGANG TIL INTERVIEWS

Udfoldelse af vores forventede tilgang til interviews med patienter og praktiserende læger

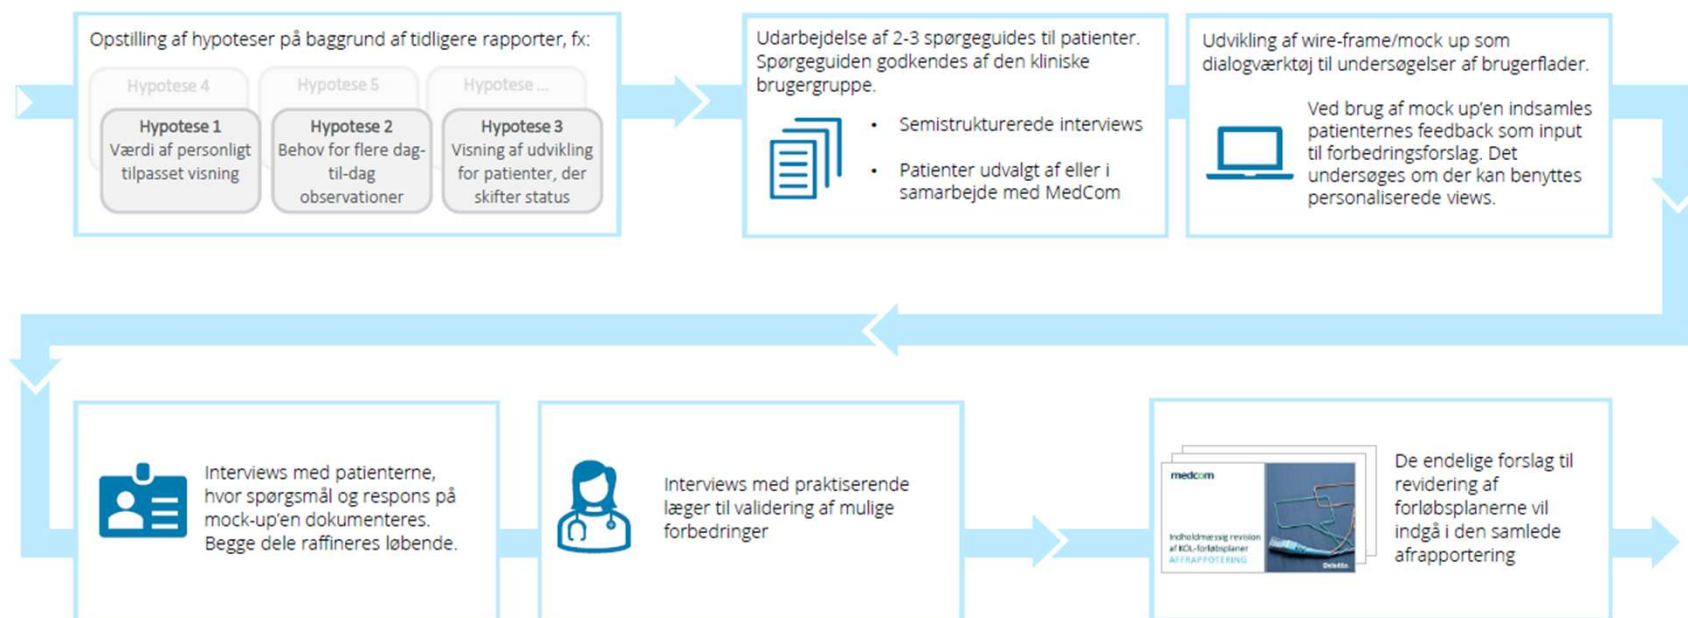



Klinisk brugergruppe (skriftlig proces)

- Fokus på patientvinklen
- Egenomsorg
- Kommunale tilbud
- Lokale tilbud
- Klinikpersonale

5. Forløbsplaner i Sundhedsjournalen

Certificering af lægesystemerne

End2end test

Opsamling på CDA

Dokumentation af forretningsregler

Kommunikation:

- Kommuner
- Praksis
- Visitkort
- Pressemeddelelse



Digitale forløbsplaner

Når du har fået lavet en forløbsplan hos din læge kan du se den i Min Læge app eller på www.sundhed.dk

Brug for hjælp?
info@sundhed.dk
Tlf. 44 22 20 80



sundhed.dk

Find din forløbsplan i Min Læge app

Tryk på "Journal" i bunden af skærmen.



Find din forløbsplan på sundhed.dk

Din forløbsplan findes under "planer" i Sundhedsjournalen på www.sundhed.dk



Lukning af forløbsplansvisning på Sundhedsmappe

- Link fra sundhedsmappe til sundhed.dk (snarest)
- Lukke visning på Sundhedsmappe
 - Ændring i formular
 - Ændring af services
 - Ændring i lægesystemer
 - Ikke tidskritisk
- De udvalgte artikler tilbydes patienthåndbogen
- Redaktionelle arbejde afsluttes





6. Ozempic – Tripple Whammy

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Godkender at der efter behandling i den kliniske brugergruppe udgives en patientliste med nyrepåvirkning.
- Godkender at en liste omkring Triple Whammy (TW) inkluderes i sammenhæng med listen om nyrepåvirkning.
- Godkender at der efter behandling i den kliniske brugergruppe udgives en liste vedr. klausuleret tilskud.



7. Økonomistatus

medcom

Økonomi status Forløbsplaner 2024			
Aktiviteter	Budget 2024	Forbrug pr. 31.05.2024	Bemærkninger
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.573.000	913.488	løn 1 md forskudt
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	101.723	
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000	0	
Brugerundersøgelse / analyse KOL	500.000	0	
Mødeforplejning og -godtgørelse			
Klinisk brugergruppe	70.000	15.541	
Teknikgruppe	75.000	5.040	
Praksisbesøg	10.000	0	
DKO workshops og undervisning	80.000	52.208	
Øvrige møder	10.000	0	
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP)	1.500.000	100.000	
LPS (ikke udbetalte aftaler fra 2023)	300.000	150.000	
Datakonsulenter	750.000	600.000	
KiAP	4.200.000	0	
Min Læge konsolidering af FLP visninger	500.000	0	
Informationsmateriale			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	30.000	2.820	
Konferencer			
Lægedage, eSundhedsobs, FSKIS	120.000	10.463	
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	40.000	27.510	
Øvrige IT udgifter	10.000	0	
Statistik			
Statistik	40.000	0	
Diverse			
Diverse inkl. repræsentation	5.000	0	
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	8.760.000		
Budget 2024 i alt inkl. lønudgifter	11.333.000	1.978.792	
Indtægter 12.800.000	12.800.000		
Aktuel rest af disponeret budget	9.354.208		
Udisponeret	1.467.000		

 Økonomi

Indstilling

Det indstilles, at styregruppen

- Tager orientering om status for projektets økonomi i 2024 til efterretning.
- Drøfter disponering af udisponerede midler i 2024.
- Drøfter den fremadrettede fordeling af forløbsplansmidlerne set i lyset af den ændrede opgavefordeling.
- Godkender at projektet udarbejder forslag til ny fordeling af forløbsplansmidlerne som godkendes af styregruppen for Digital Almen Praksis.

Nuværende fordeling (faste beløb):

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Lægesystemleverandører: | 1.500.000 kr (samlet 6 LPS) |
| • KiAP: | 4.200.000 kr |
| • MedCom (løn) | 2.600.000 kr |


Den resterende del af FLP bevillingen disponeres jf. budgettet.

8. Godkendelse af driftsbidrag til appen Min Læge for formidling af planerne

Indstilling

Det indstilles at styregruppen

- Godkender, at der fremadrettet indgås aftale om at betale et årligt driftsbidrag til Min Læge app for den løbende vedligeholdelse af de 3 forløbsplaner mv., som formidles via appen.

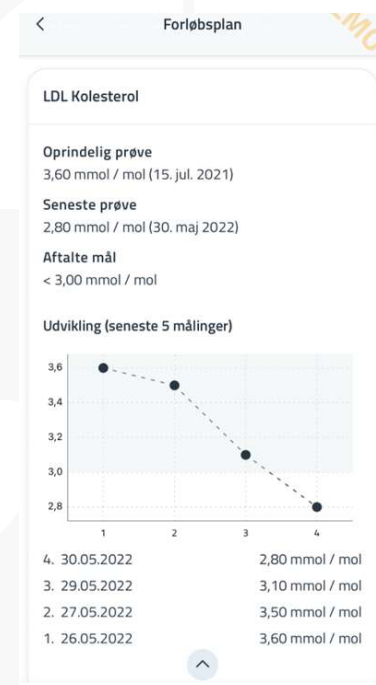



9. Status på drift og udvikling (O)

Driften har været stabil

Fokus på driftsstabilitet og procedurer for releases

Behov for opsamling vedrørende datakomplethed/kvalitet

Lægesystemerne:

- Understøttelse af henvisningen udestår for 3 leverandører
- Grundlæggende FLP funktionalitet (datakomplethed, driftsstabilitet)
- Patientfortegnelser
- Diagnosekortet
- Opgaver ifm. lukning af Sundhedsmappe

FORLØBSPLANER I ALMEN PRAKSIS		2024											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
AP 1 PROJEKLEDELSE OG KVALITETSSIKRING													
1.1	Teknisk projektledelse og kvalitetssikring												
AP 2 UDVIKLING OG VEDLIGEHOLD													
2.1	Monitorering af driften												
2.2	Monitorering af LPS synkronisering												
2.3	Behandlingsrekommandationer												
2.4	Henvisning til kommunale tilbud												
2.5	Tilpasning til diagnosekortet (analys + evt. udvikling)												
2.6	Datakvalitet												
2.7	Visning af FLP i SJ4												
2.8	Adskille RKKP indb. og klyngevisning fra FLP												
2.9	Forberede at planer ikke sendes til Sundhedsmappe												
AP 3 RELEASEPLANLÆGNING													
3.1	FLP releases												

Version 0.7 Den 13. maj 2024

Aftalt

Forsinket

Foreløbig




10. Status på udbredelse og udbredelsesaktiviteter

Mål 2024	Status 1. juni 2024
180.000 forløbsplaner oprettet	101.921 forløbsplaner oprettet
Antal klinikker som har udarbejdet min. 5 nye planer pr. kapacitet (og dermed opfylder OK22): skal være 85% pr. 31. december 2024.	78% af klinikkerne opfylder OK22 krav pr. 1. juni 2024 (regionsklinikker og udbudsklinikker frasorteret)





Andel klinikker, der har lavet min. 5 nye planer pr. læge - udvikling

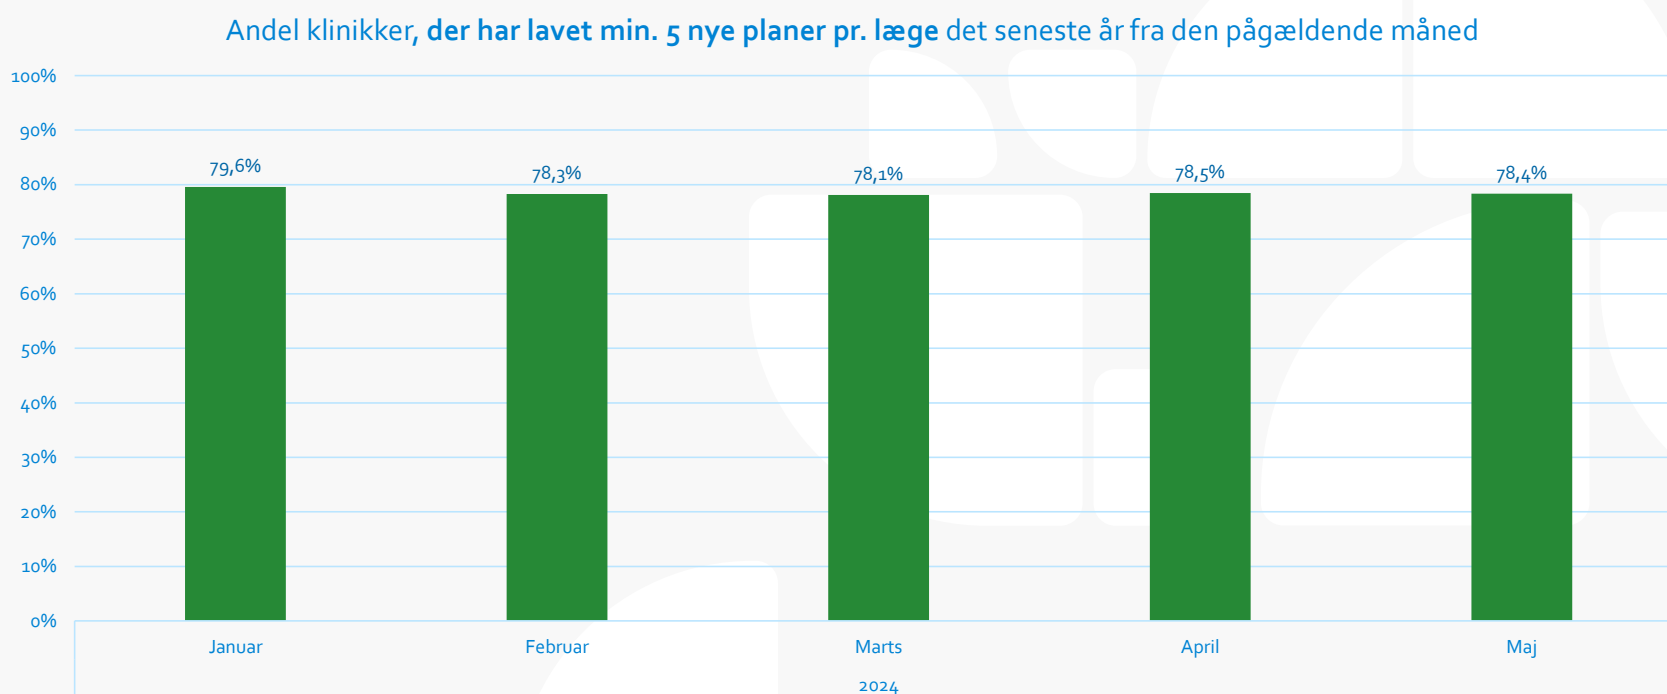


Ny plan: En plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.

Antal lægehuse alt i maj 2024 (5,80): 1599

Datakilde: PLSP. Nedlukkede lægehuse, samt regions- og udbudsklinikker, frasorteret.



Antal forløbsplaner (nye og vedligeholdte), akk. seneste 12 måneder

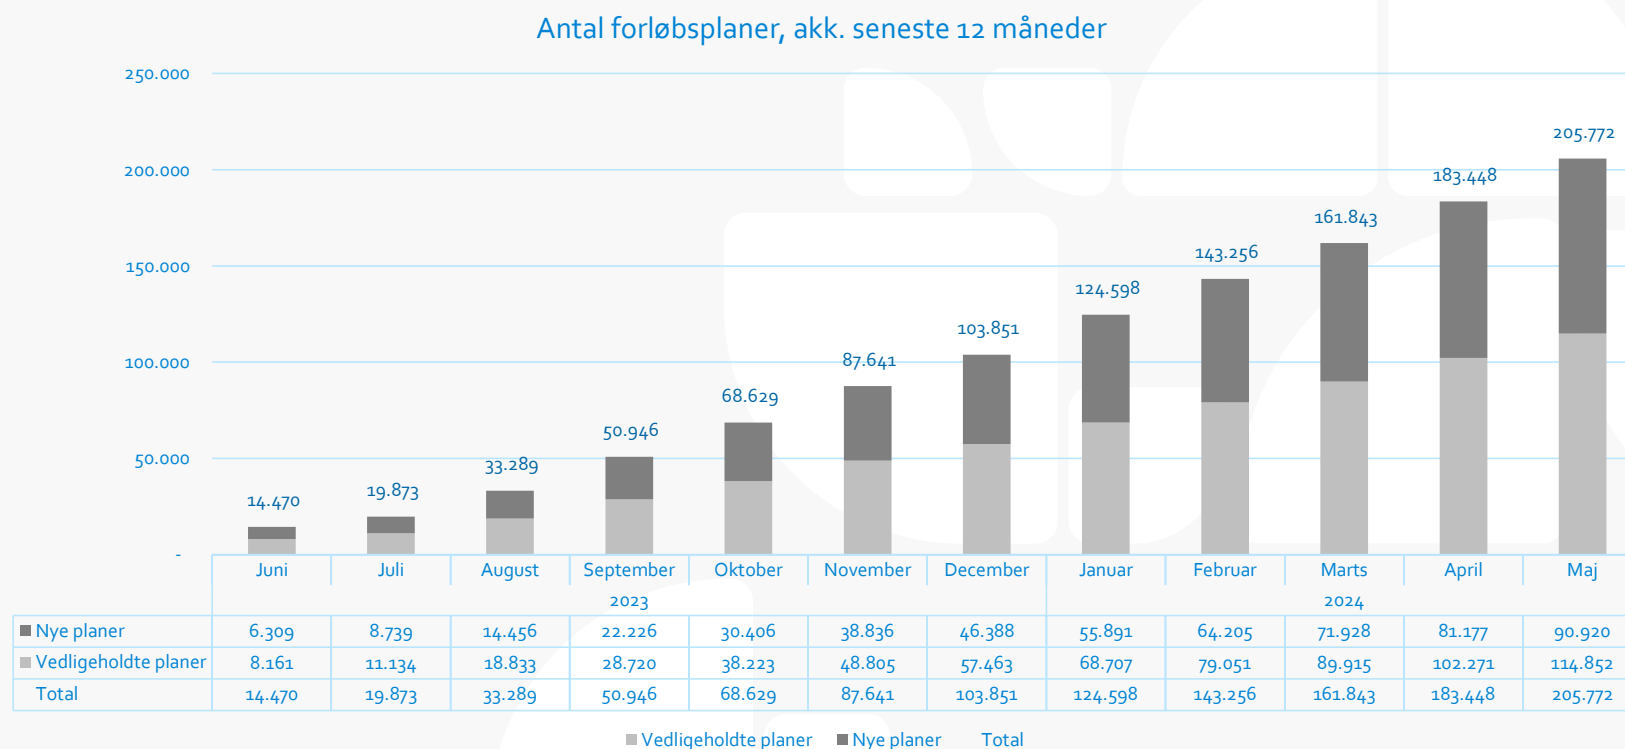


Ny plan: En plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.

Datakilde: PLSP




Antal forløbsplaner (nye og vedligeholdte), akk. seneste 12 måneder

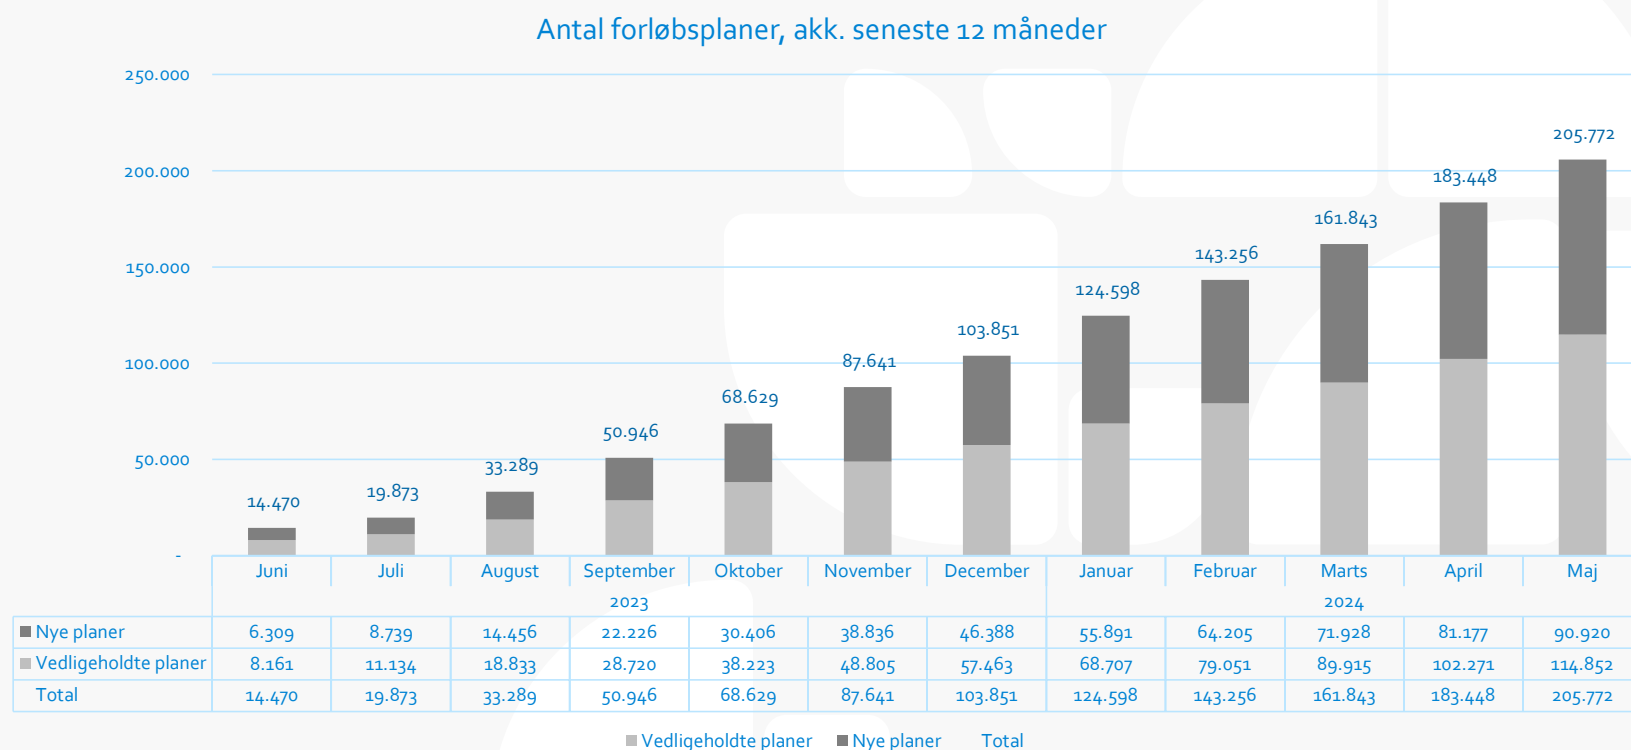

Ny plan: En plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.

Datakilde: PLSP

Patienter med aktuel forløbsplan (antal)

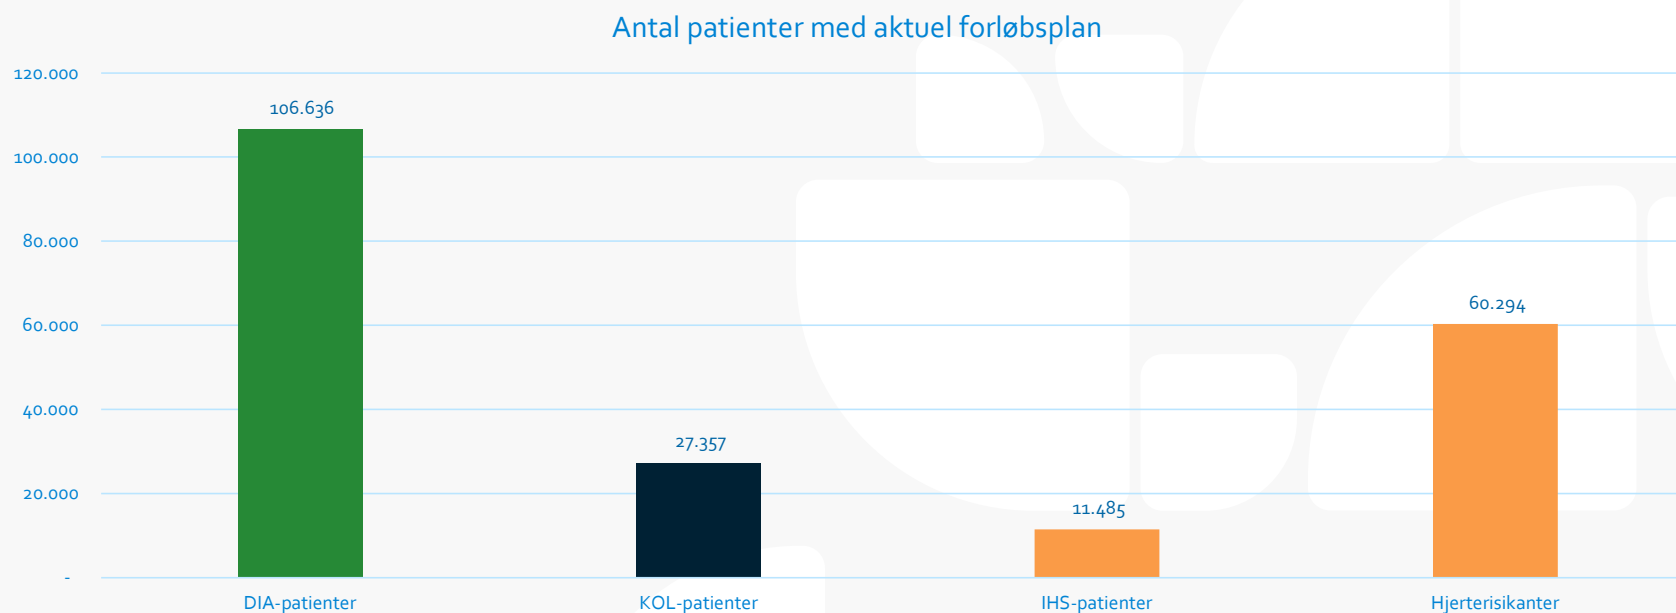


Bemærkning: Patienter med aktuel forløbsplan er opgjort som antal oprettede (nye og vedligeholdte) planer inden for det seneste år. En ny plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.

Bemærkning: Der må tages forbehold for, at det ikke kan afgøres, om én vedligeholdt plan = én patient med aktuel forløbsplan, da patienter kan få opdateret deres forløbsplan mere end én gang årligt. Tallet kan således været overestimeret.

Bemærkning: Datakilde: PLSP + Danmarks Statistik

Patienter med aktuel forløbsplan (andel)

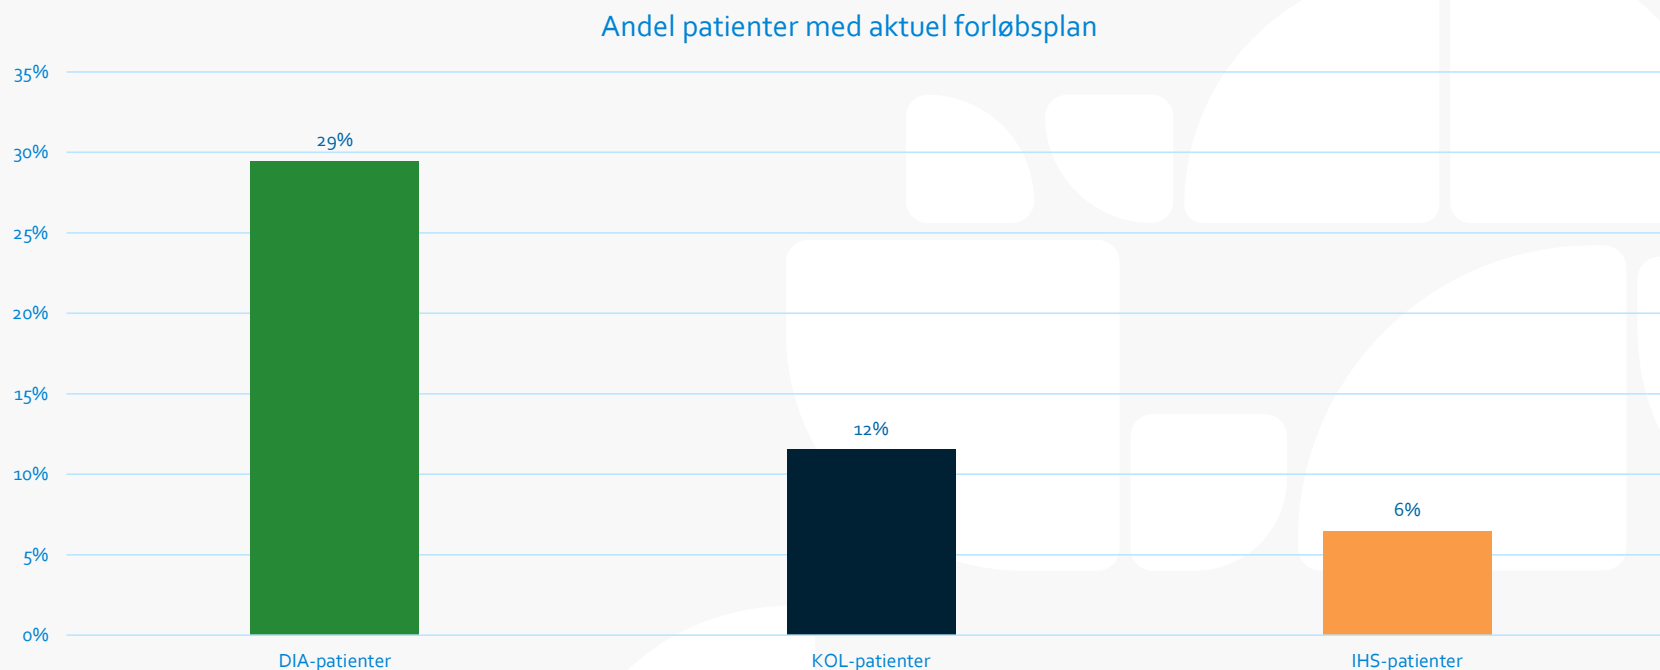

Bemærkning: Patienter med aktuel forløbsplan er opgjort som antal oprettede (nye og vedligeholdte) planer inden for det seneste år. En ny plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.


Andel er opgjort på baggrund af estimeret antal patienter i % af befolkningen: KOL: 5%, DIA: 6,1%, Iskæmisk hjertesygdom: 3%. Befolkningstal 2023K4: 5.928.364.

Bemærkning: Der må tages forbehold for, at det ikke kan afgøres, om én vedligeholdt plan = én patient med aktuel forløbsplan, da patienter kan få opdateret deres forløbsplan mere end én gang årligt. Tallet kan således været overestimeret.

Bemærkning: Datakilde: PLSP + Danmarks Statistik



Aktive lægehuse seneste år (Total)

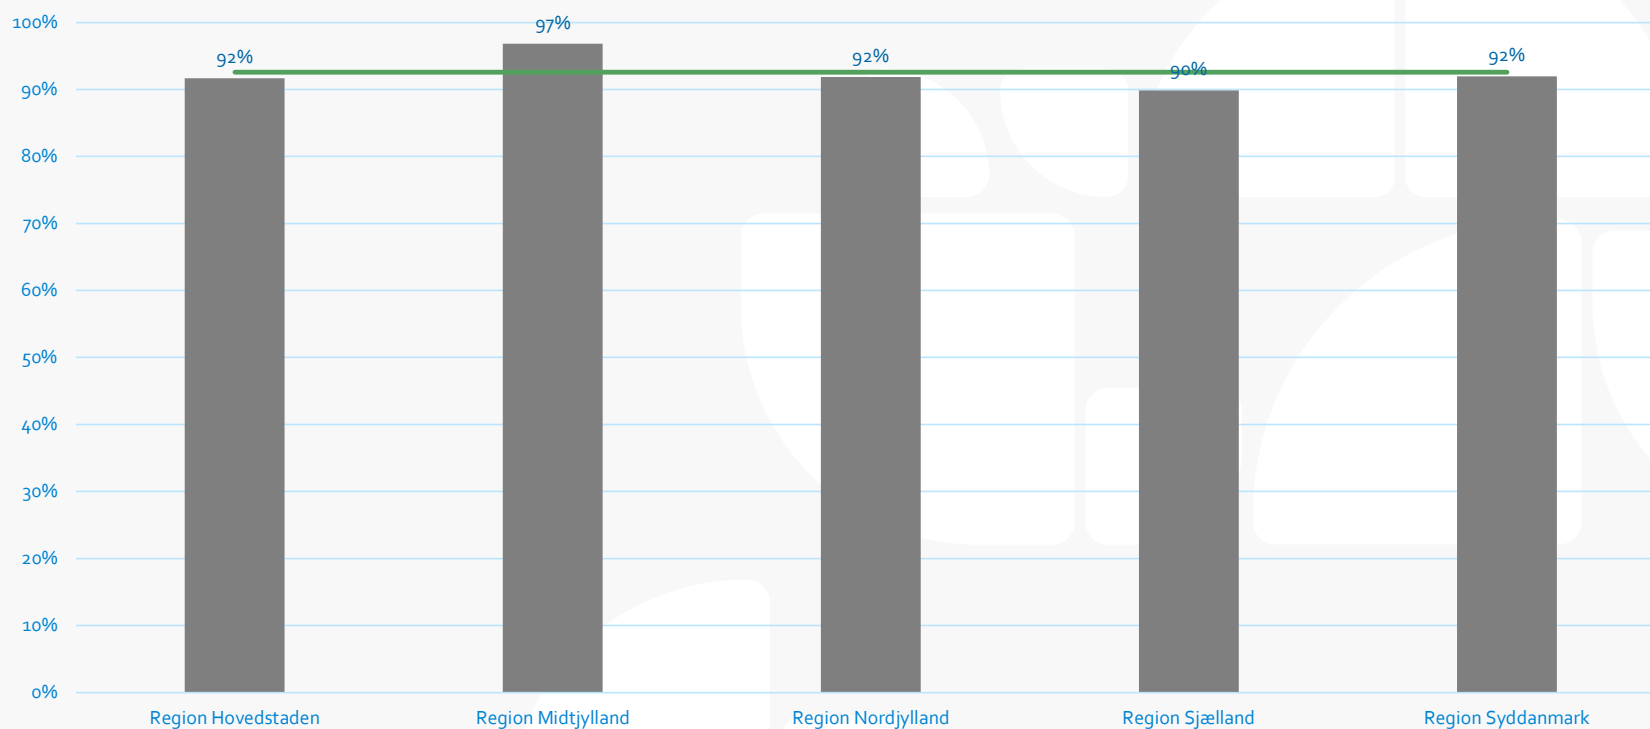


Aktivt lægehus: Et lægehus betegnes som aktivt, hvis det har udarbejdet eller vedligeholdt minimum én plan i løbet af de seneste 12 måneder

Antal lægehuse i alt (5, 80): 1632

Datkilde: PLSP. Nedluktede lægehuse frasorteret.



Fordeling af klinikker på antal oprettede nye planer

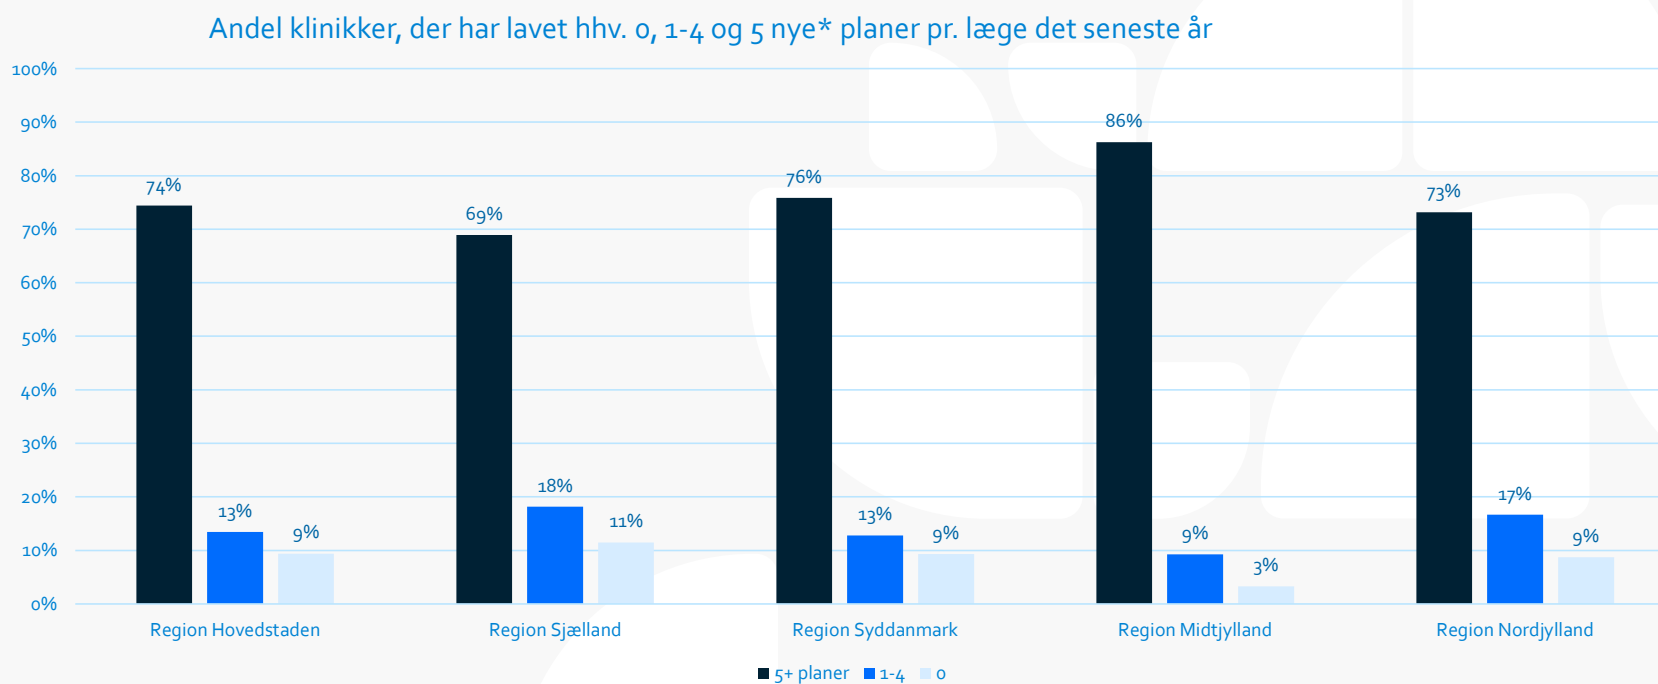

Ny plan: En plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.

Antal lægehuse (5, 80) i alt: 1599

Datakilde: PLSP. Lukkede lægehuse, samt regions- og udbudsklinikker, frasorteret

10. Projektets risici

Sandsynlighed	Forventet		#6			Udbredelse: #1
	Sandsynligt					Teknik: #3
	Mindre sandsynligt		#1	#3		Prioritering: #6
	Usandsynligt					
		Uvæsentlig	Generende	Kritisk	Uacceptabelt	
Konsekvens						

12. Eventuelt

TAK for denne gang!

