



DAP-styregruppemøde

30. april 2026



Dagsorden

1. Meddelelser
2. Aktuel status på projekter i Digital Almen Praksis
 - Apps i almen praksis
 - Datastandardisering i almen praksis
 - Deling af lokale laboratoriesvar
 - Diagnosekort fase 2
 - Digital svangrejournel i almen praksis
 - Graviditetsmappen v2 i almen praksis
 - Intelligent indbakke
 - Kronikerpakker i almen praksis
 - Klinikens cockpit
 - Forløbsplaner
 - Kommunale prøvesvar på EHMI
3. Evt. og næste møde





1. Meddelelser



2. Aktuel status på projekter i Digital Almen Praksis



Apps i almen praksis

- **Formål**

- Udvikling og afprøvning af enkel og lettilgængelig teknisk løsning, hvor lægen via sit LPS/PLSP kan få adgang til et katalog af sundhedsapps, som kan anbefales til patienten.

- **Status**

- Der er indgået samarbejdsaftale med sundhed.dk om at udvikle API mellem udstilling af national app-liste og projektets tekniske løsning. API er meldt forsinket og forventes tidligst klar Q3 2026.
- De første 12 sundhedsapps er anbefalet af Nævnet for Sundhedsapps og kan ses på sundhed.dk.
- Som følge af det forsinkede API og etableringen af en national app-liste er det blandt projektets parter besluttet at udbrede den nationale liste til alle almen praksis via den tekniske løsning, der har været anvendt i pilotperioden. Det vil være en "håndholdt løsning", da app-listen endnu ikke kan hentes digital.
- Der arbejdes på en kommunikationsplan ift. information til alle læger.

Anbefalede Sundhedsapps

Overblikket over anbefalede sundhedsapps hjælper dig med at finde apps til din sundhed forebyggelse af sygdomme eller hjælpe dig med at forbedre din sundhed. Alle viste apps



apoteket

Information om din medicin

Formål

Skabe overblik over og støtte aktiviteter ifm. medicinforbrug

Målgruppe

Borgere over 15 år med bopæl i Danmark

Sundhedskategori

Generel

Læs mere om apoteket



Hedia Diabetes Ass

Anbefaling af insulinosis

Formål

Give støtte til beslutning om insulinosis blodsukker, kulhydratindtag og fysisk akt

Målgruppe

Voksne med type 1 eller type 2 diabetes, med hurtigtvirkende insulin

Sundhedskategori

Hormoner og stofskifte

Læs mere om Hedia Diabetes Assistant



Meta Learn

Hjælp til at styrke mentalt fokus

Formål

Tilbyde øvelser til at reducere overtænkning samt træne opmærksomhed og fokus



Min Læge

Nem adgang til kommunikation

Formål

Koordinere og skabe overblik over aftaler medicin


Datastandardisering i almen praksis

- **Formål:**

- 1) Afprøvning af en model for fremadrettet standardisering af struktureret data på tværs af lægepraksissystemerne (LPS)
- 2) Udvikling af løsningsmodeller til opdatering af historiske data i LPS'erne
- 3) Udvikling af løsningsmodeller for validering af data ved deling af hele journaler mellem praksisklinikker

- **Status:**

- MedCom har ikke kunne prioritere projektet i 2026 endnu, da der er andre projekter med højere prioritet, herunder GMv2 og deling af journalnotater fra almen praksis
- MedCom afventer fremdriften i de to nævnte projekter, og vurdere ressourcerne efter sommerferien

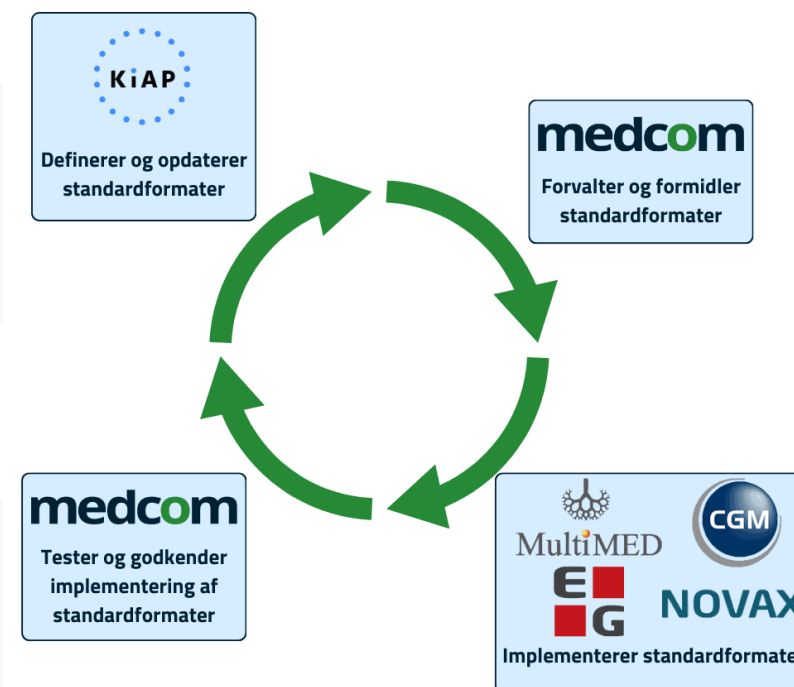



Deling af lokale laboratoriesvar

- **Formål:**

- At sikre, at borgeres adgang til egne laboratoriesvar. Svarene bliver tilgængelige via borgervisning i Sundhedsjournalen samt i de to apps MinSundhed og Min Læge.
- Projektet omfatter deling af analyseresultater og test udført i klinikken i almen praksis til de nationale databanker LABA og MiBa samt PLSP Health Hub.

- **Status:**

- Projektet er grundet uklarhed om håndtering af forretningsreglerne blevet forsinket, og for hurtigst muligt at kunne sætte løsningen i drift arbejdes der på at lave en trinvis idriftsættelse. Første del er et teknisk spor med deling af LPS-data til databankerne, men ikke videre derfra. Anden del er en fuld idriftsættelse af løsningen.
- Der ønskes nationale forretningsregler for deling af laboratoriesvar, men indtil de er udarbejdet af Digital Sundhed Danmark, arbejdes der efter følgende:
 - 1) Uanset, hvilken databank der sendes til, anvendes forretningsreglerne for MiBa, hvis ikke andet er defineret
 - 2) Ønskes et svar rettet i en databank, sendes en rettelse, som MedCom-standard understøtter (et enkelt svar kan ikke slettes, men annulleres med en rettelse, hvis det fx er på en forkert patient)
 - 3) Ønskes data slettet i en databank, skal det ske ved personlig henvendelse til databanken, da standarden ikke understøtter en slettefunktion. Dette kræver sandsynligvis en aftale med de respektive databanker





Diagnosekort fase 2

- **Formål:**

- Konsolidering og videreførelse af resultaterne fra de to tidligere projekter *Diagnosekort i almen praksis* og *Deling af diagnoser fra almen praksis*.
- Understøtte fortsat udbredelse og ibrugtagning i klinikkerne og sikre stabil og standardiseret teknisk deling af udvalgte diagnoser fra almen praksis.

- **Status:**

- For 2026 er der afsat DAP-midler til udbredelse af Diagnosekort fase 2
- Der er indgået samarbejdsaftaler i 2026 med datakonsulenter i alle fem regioner
- Projektet er i dialog med de resterende LPS'er om planlægning og gennemførelse af gentest ift. deling af diagnoser
- Sundhedsdatastyrelsen forbereder evaluering af tværsektoriel deling af diagnoser. Resultatet af denne forventes at indgå som væsentlig input til videre drøftelser i 2026 om løft af diagnosepakke-standarden til version 2.0 for LPS'er og standarden for deling af diagnoser (ConditionList) på tværs af PLSP og øvrige anvendelsessystemer






Digital svangrejournal i almen praksis

- **Formål:**

- Digital svangrejournal understøtter de arbejdsgange, almen praksis har i et graviditetsforløb, herunder digital oprettelse af svangerskabsjournal og vandrejournal.

- **Status:**

- EG Clinea, XMO, WinPLC, MultiMed, Novax og Vena er testet og alle almen praksis klinikker har fået adgang til Digital Svangrejournal.
- Anvendelsesgraden i ap er ca. 70 %.

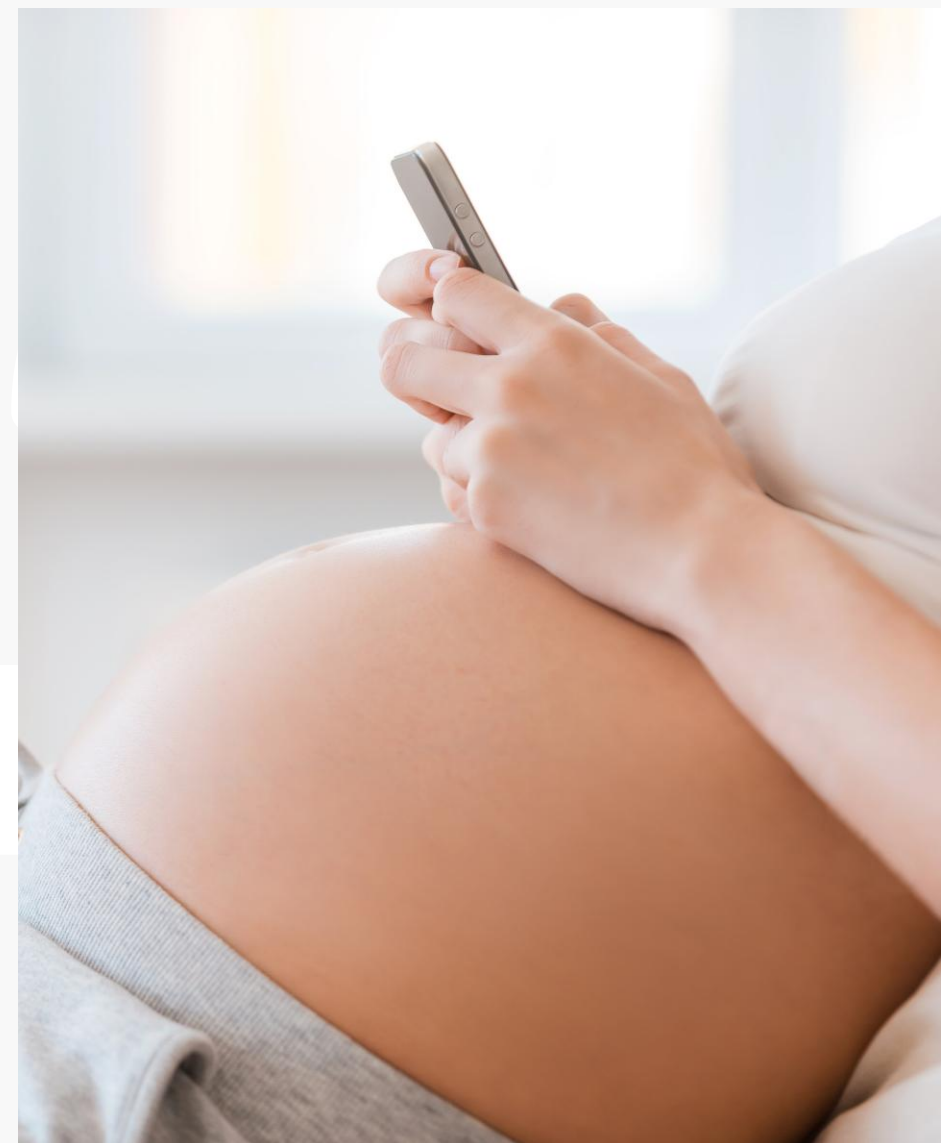




Implementering af GMv2 i almen prak

- **Formål**

- National digital løsning, som erstatter Vandre- og Svangrejournalen som papirbåren journal. Projektet ledes af Sundhedsdatastyrelsen, mens MedCom leverer tre CDA standarder, som skal understøtte løsningen. MedCom står for udbredelsesindsatsen i almen praksis

- **Status**

- Primo april er der afholdt connectathon mhp. afprøvning af den kommende GMv2.
- Styregruppen for Digital løsning til graviditetsforløb har på seneste møde (21. april 2026) sagt endelig "go!" til, at den nationale løsning idriftsættes den 2. juni 2026.
- Der planlægges 4 spørgesessioner sammen med PLO's efteruddannelsesafdeling efter idriftsættelsen.
- Plan for aktiviteter er under udarbejdelse

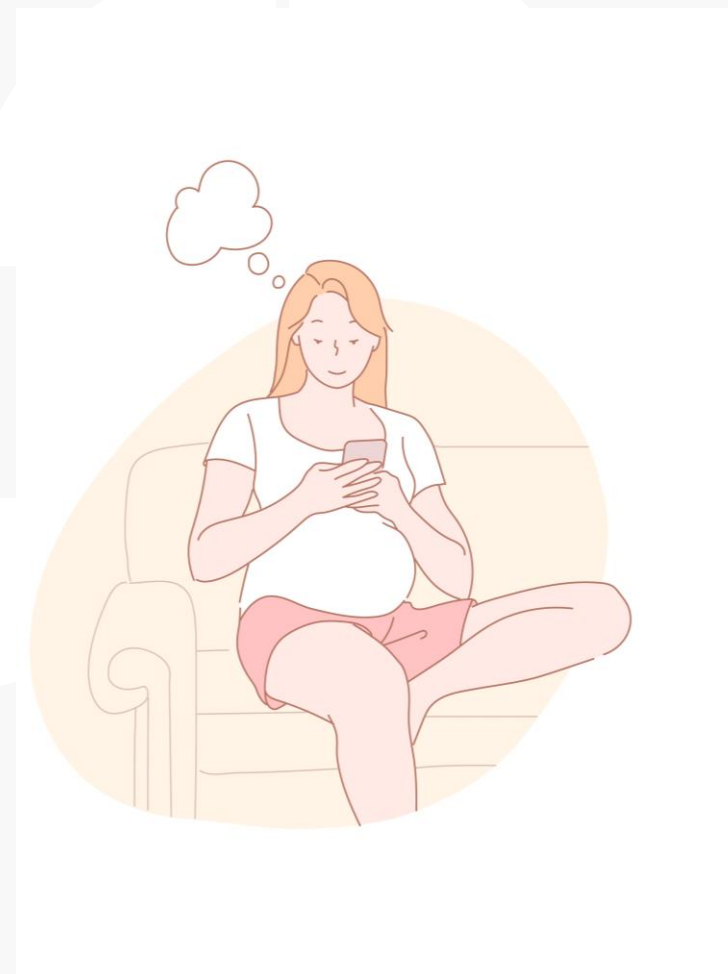



Intelligent indbakke

- **Formål**

- Etablering af en mere effektiv indbakke, der letter lægens og klinikpersonalets håndtering af indkommende post, med fokus på automatisk håndtering af labsvar.
- Projektet er frivilligt

- **Status**

- MedCom testede og godkendte EG Clinea i dec. 2024.
- MedCom tilbød test ifm. testcamp i sep. 2025, hvor yderligere to LPS'er blev testet og godkendt.
- De sidste tre LPS'er har ikke sendt testanmodning, dog har ét system udtalt, at de ønsker at implementere løsningen.
- Hvis projektet skal give økonomisk tilskud til udviklingen, skal test og godkendelse ske inden udgangen af 2026.





Kronikerpakker i almen praksis (AMT)

- **Formål**

- En digital løsning til almen praksis, som understøtter kronikerpakkerne og sikrer, at patienter med kronisk sygdom modtager sammenhængende, proaktiv og ensartet behandling. Løsningen til KOL og Lænderygsmarter skal være klar til drift 1. januar 2027.
- Projektet, også kaldet AMT-projektet, er en del af programmet for digital understøttelse kronikerpakker, og skal koordinere leverancer fra Klinikens Cockpit, forløbsplaner mm.

- **Status**

- Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet med Kronikerpakker i 2026. Tidsplanen er en operationalisering af rapporten "Digital understøttelse af kronikerpakker, analyse", der blev godkendt på DAP-styregruppemødet den 16. december 2025.
- Tidsplan: 23 aktiviteter og ca. 50 interne milepæle
- Tidsplanen er afstemt og koordineret med projektledelse for forløbsplansprojektet, Klinikens cockpit, KiAP, PLSP og LPS-leverandørerne.
- Udvalgte afhængigheder til kronikerpakkeprojektet er koordineret med programmet for digital understøttelse kronikerpakker.
- AMT-projektet har fokus på en grundig test af den samlede løsning, herunder afholdelse af 2-dags Connectathon i oktober 2026 med deltagelse af alle aktører (40-50 deltagere).

- **Største risici**

- Manglende/forsinket udarbejdelse af sygdomsspecifikke kronikerpakker i SST
- Manglende/forsinket udarbejdelse af Klinisk vejledning til Lænderygsmarter hos DSAM
- Manglende aftale om arbejde med kronikerpakkeforløb i almen praksis




Klinikkens cockpit

- **Formål:**

- Udvikling og konsolidering af LPS'er, som anvendes i almen praksis i dag og bidrage til et bedre tværsektorielt samarbejde.
- Identificere og hjælpe patienter med størst behov, lette tidspres hos ap og gøre det lettere for lægerne at varetage tovholderfunktion.

- **Status:**

- Det er besluttet, at der fortsat skal afsættes midler til Klinikkens cockpit, så der kan etableres god forvaltning af profiler. I første omgang i 2026, hvor der forberedes overgang til Digital Sundhed Danmark i 2027.
- PLO og Steno Diabetes Center Århus indgår i perioden marts til august 2026 en samarbejdsaftale om en Proof of Concept, hvor en demensprofil vises i SAMBLIK.
- De sidste tre LPS'er er i gang med at implementere Klinikken cockpit og forventes i mål i 2026.
- Klinikkens cockpit bidrager til den digitale understøttelse af kronikerpakker med implementering, test og udbredelse af KC i alle LPS'er i 2026 og udvikling af profilerne KOL og Lænderygsmerter.

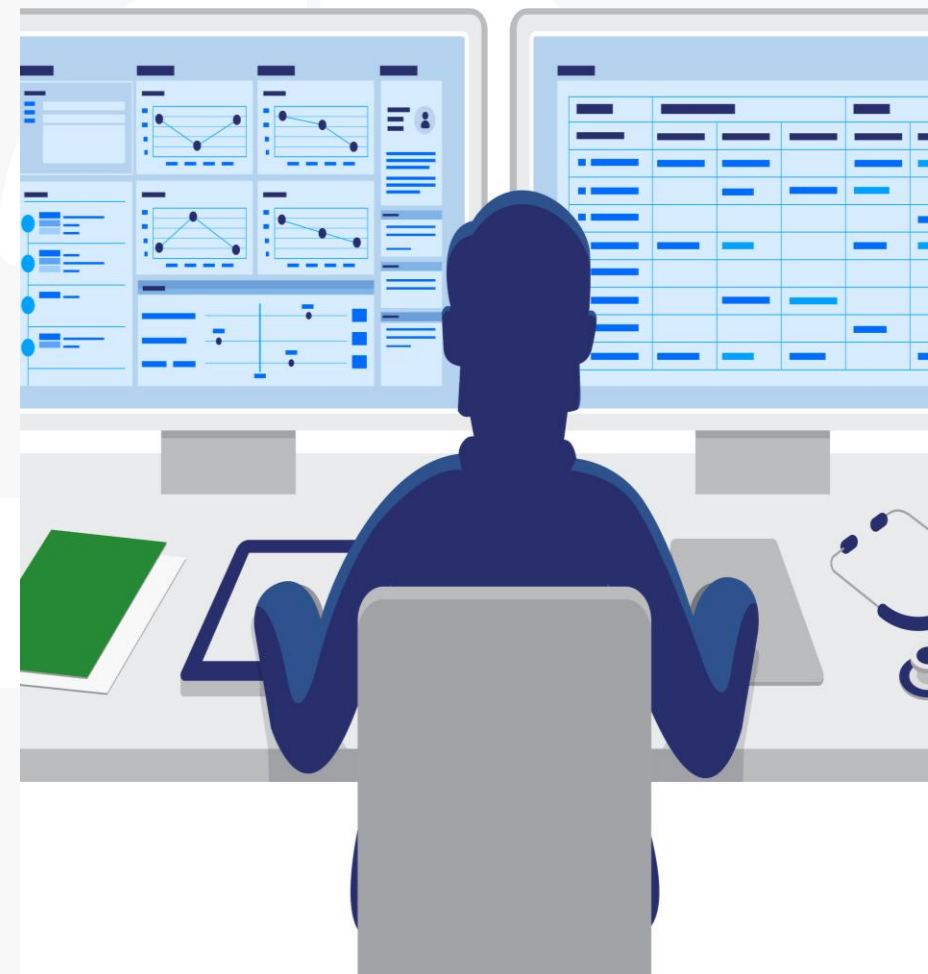




Forløbsplaner (FLP)

- **Formål**

- At give patienter med kronisk sygdom bedre overblik over behandlingsforløbet i almen praksis og bedre grundlag for egenomsorg.

- **Status**

- Hovedformålet i 2026 er at bidrage til den digitale understøttelse af Kronikerpakker (KOL og lænderygsmærter).
- FLP skal levere understøttelse af klinikkernes udarbejdelse af behandlingsplaner. (Leverance fra AMT-delprojektet under programmet "Pakkeforløb for mennesker med kronisk sygdom").
- Understøttelsen baseres på de kliniske vejledninger fra DSAM og "Generisk model for pakkeforløb for mennesker med kronisk sygdom" fra SST.
- Udarbejdelse af formularer, som skal understøtte lægens oprettelse af behandlingsplanen, påvirkes af regeringsdannelsen, da de kliniske arbejdsgrupper ikke kan mødes pt. Det samme gør sig gældende for den nødvendige involvering af PLO og DSAM.
- Udbredelsen af anvendelsen af FLP understøttes fortsat af datakonsulenterne i alle regioner. Der blev udarbejdet mere end 300.000 FLP de sidste 12 mdr. Mere end 90% af klinikkerne anvendte FLP i marts 2026. 81% af klinikkerne lever op til kravene i OK22 om oprettelse af min. 5 FLP pr. læge/år.

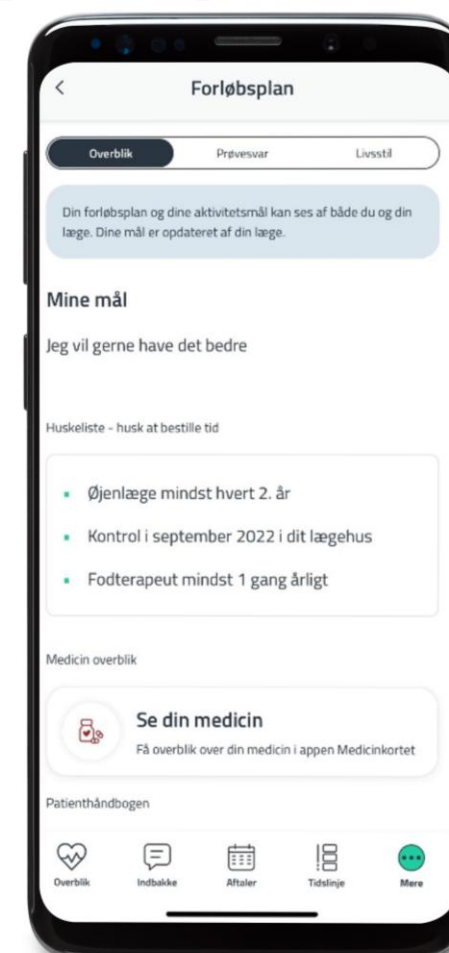



Kommunale prøvesvar på EHMI



• Formål

- Kommunale prøvesvar til almen praksis via FHIR-standard
- Afprøvning af FHIR standard på ny infrastruktur (dataoverførsel og dokumentdeling)
- Driftserfaringer med ny infrastruktur og viden om gevsinter, investeringsbehov og omkostninger

• Status og plan

- God fremdrift i testforløb med Systematic, Kvalitets IT, Multimed og EG. Alle godkendt på standarden.
- Afprøvning 1. september – 30. november 2026 (Aarhus Kommune og 20-25 lægepraksis)
- Efterfølgende evaluering afsluttes 1. april 2027. Proces med rekruttering af lægepraksis igangsat



6. Eventuelt og næste møde

Næste møde er tirsdag den 23. juni kl. 13.00-15.00

Det foreslås at datoen **ændres** til torsdag den 25. juni og udvides med en halv time kl. 12.30-15.00 eller 13.00-15.30
